

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
REPORTE FINAL DE SEGUIMIENTO DE OBRA**



Obra: PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO DE TULUM

Localidad: TULUM

PERIODO DE EJECUCION 20/04/2022 /AL 18/06/2022


Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

TULUM QUINTANA ROO A 18 DE JUNIO DE 2022


Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/001/RP/2022

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
A-1	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO	\$429,577.26	\$429,577.26	0
A-2	ESCARIFICADO DE TERRACERIA EXISTENTE EN MAL ESTADO	\$1,040,579.11	1,040,579.11	0
A-3	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO CEMENTANTE	\$1,973,356.22	1,973,356.22	0
A-4	FORMACION Y COMPACTACION DE TERRACERIAS	\$369,264.47	\$369,264.47	0
A-5	RIEGO DE IMPREGNACION A BASE DE EMULCION CATIONICA	\$507,780.00	\$507,780.00	0
A-6	FORMACION DE CARPETA ASFALTICA EN FRIJO DE 2.5 CM.COMPACTO	\$3,425,760.00	\$3,425,760.00	0

SUBTOTAL	\$7,746,317.06	\$7,746,317.06
16% IVA	\$1,239,410.73	\$1,239,410.73
TOTAL 100 %	\$8,985,727.79	\$8,985,727.79

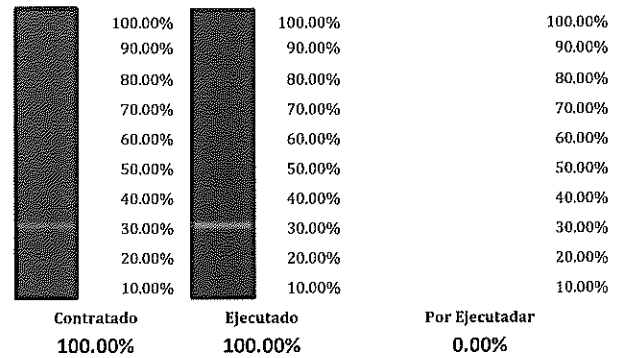

Avance Financiero

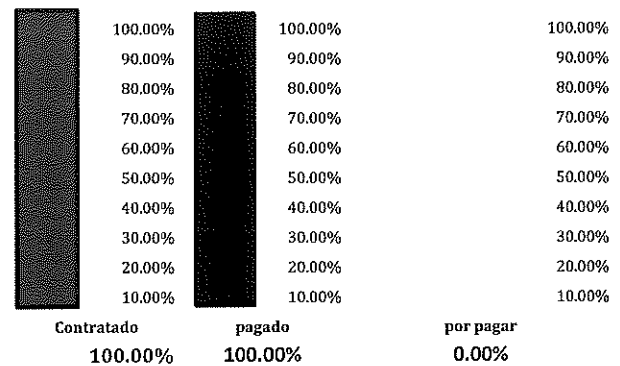

ELABORÓ:

ING. ROBERTO PEREZ GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA
