



**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBRA**



Obra: Mejoramiento de la imagen urbana de unidad deportiva de Tulum

Localidad: TULUM


Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

PERIODO DE EJECUCION : 06 DE MAYO AL 20 DE JULIO DE 2022


Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/002/RP/2022

TULUM QUINTANA ROO A 20 DE JULIO DE 2022

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
A	CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DOS	\$ 99,739.90	\$ 99,739.90	
B	CANCHA DE FUTBOL RAPIDO UNO	\$ 1,299,992.34	\$ 1,299,992.34	\$ -
C	CANCHA DE FURBOL SIETE	\$ 1,047,506.68	\$ 1,047,506.68	\$ -
D	ÁREA INFANTIL	\$ 581,315.85	\$ 581,315.85	\$ -
E	CANCHA FUTBOL SOCCER	\$ 581,315.85	\$ 581,315.85	\$ -
F	ESTACIONAMIENTO	\$ 492,543.38	\$ -	
G	PISTA PARA CORRER	\$ 83,433.06	\$ -	
H	EXPLANADA	\$ 466,895.18	\$ -	
J	FACHADA PRINCIPAL	\$ 775,524.73	\$ -	
K	INSTALACION ELECTRICA Y ALIMENTACIÓN	\$ 220,789.36	\$ -	
L	BARDA	\$ 1,328,322.01	\$ 1,625,544.61	
M	PALAPA	\$ 7,345.22	\$ -	
		\$ 6,884,983.66	\$ 5,135,675.33	\$ -
		\$ 1,101,597.39	\$ 821,708.05	\$ -
		\$ 7,986,581.05	\$ 5,957,383.58	\$ -

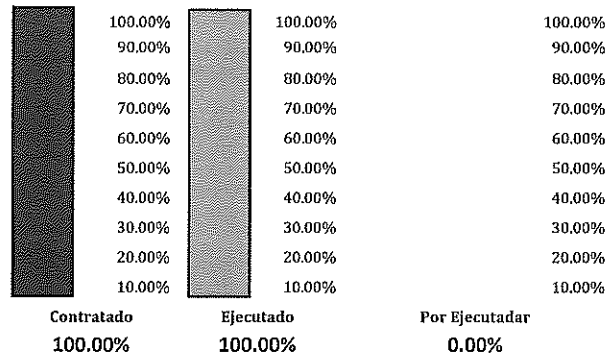

Avance Financiero

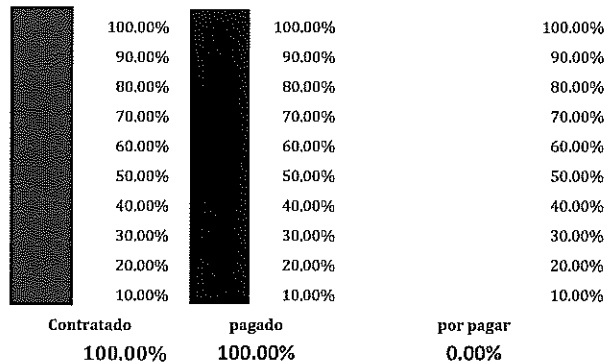

ELABORÓ:

ARQ. ALEJANDRO RAMIREZ CORDERO
RESIDENTE DE OBRA
