

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA



Obra: REHABILITACION DE OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR CONTRALORIA Y SALUD MUNICIPAL

Localidad: TULUM

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGOYSPM/COP3P/005/RP/2022

REPORTE

08/06/2023

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	EJECUTADO TOTAL	POR EJECUTAR
-------	---------	------------	-----------	-----------------	--------------


REHABILITACION DE OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR
CONTRALORIA Y SALUD MUNICIPAL

A	TRABAJOS EN LOSA EN OFICIALIA Y CONTRALORIA	\$337,922.24	\$337,922.24	\$337,922.24	\$0.00
B	OFICIALIA	\$171,716.51	\$171,716.51	\$171,716.51	\$0.00
C	TERRAZA (ACCESO TRASERO DE OFICIALIA)	\$147,342.13	\$147,342.13	\$147,342.13	\$0.00
D	BAÑO TERRAZA (ACCESO TRASERO DE OFICIALIA)	\$49,572.50	\$49,572.50	\$49,572.50	\$0.00
E	DIRECCION DE SALUD	\$1,502.50	\$1,502.50	\$1,502.50	\$0.00
F	CONTRALORIA EXTRAORDINARIOS	\$103,484.09 \$43,396.20	\$103,484.09 \$43,396.20	\$103,484.09 \$43,396.20	\$0.00 \$0.00


\$	854,936.17	\$	854,936.17	\$	854,936.17	\$	-
TOTAL DE OFICIALIA MAYOR		\$	854,936.17	\$	854,936.17	\$	-

\$	854,936.17	\$	854,936.17	\$	854,936.17	\$	-
\$	136,789.79	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%		
\$	991,725.96						

Avance Físico

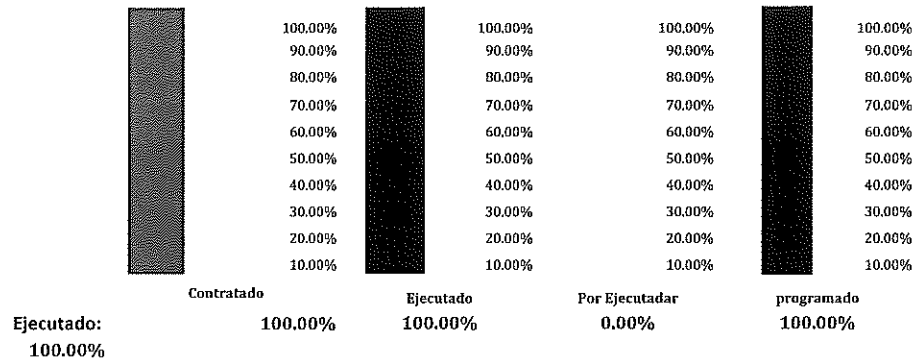

Avance Financiero

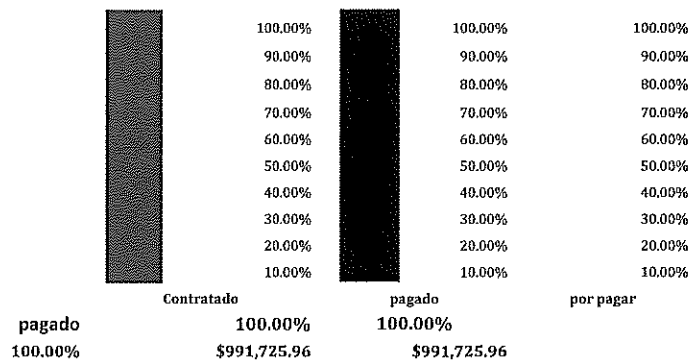

ELABORO
MANLIO CABRERA ARGAEZ
RESIDENTE DE OBRA
