

**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
REPORTE FINAL DE SEGUIMIENTO DE OBRA**



Obra: "CONSTRUCCION DE CELDA EMERGENTE EN EL RELLENO SANITARIO DE TULUM"

Localidad: TULUM



PERIODO DE EJECUCION 03/05/2022 /AL 16/07/2022

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

TULUM QUINTANA ROO A 16 DE JULIO DE 2022

Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/010/RP/2022

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
A00-1	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO	\$ 71,784.00	\$ 71,784.00	\$0.00
A00-2	EXCAVACION EN MATERIAL II CON MAQUINARIA PESADA	\$ 1,204,982.50	\$ 1,204,982.50	\$0.00
A00-3	EXCAVACION EN MATERIAL III (ROCA) CON MAQ. PESADA	\$ 4,177,062.00	\$4,177,062.00	\$0.00
A00-4	PREPARACION, CONFORMACION Y COMPACTACION	\$ 344,425.00	\$344,425.00	\$0.00
A00-5	GEO TEXTIL 400GR/MZ NO TEJIDO COMPUESTO POR FIBRAS	\$ 271,560.00	\$271,560.00	\$0.00
A00-6	IMPERMEABILISACION DE CELDA A BASE DE GEOMEMBRANA	\$ 648,349.50	\$648,349.50	\$0.00
A00-7	AFINE DE PENDIENTES EN TALUD DE CELDA EN FORMA MANUAL	\$ 110,952.00	\$110,952.00	\$0.00
A00-8	RELLENO A VOLTEO PARA PROTECCION DE GEOSINTETICOS	\$ 119,587.50	\$119,587.50	\$0.00
A00-9	CONST. DE CANAL DE LIXIVIADOS E INTERCONEXION A CARC.	\$ 44,517.20	\$44,517.20	\$0.00
A00-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA PARA FILTROS	\$ 64,123.02	\$64,123.02	\$0.00
	SUBTOTAL	\$ 7,057,342.72	\$7,057,342.72	\$0.00
	16% IVA	\$ 1,129,174.84	\$ 1,129,174.84	\$0.00
	TOTAL 100 %	\$ 8,186,517.56	\$8,186,517.56	\$0.00

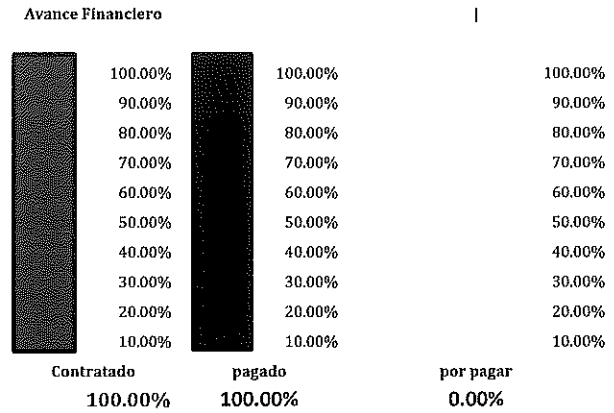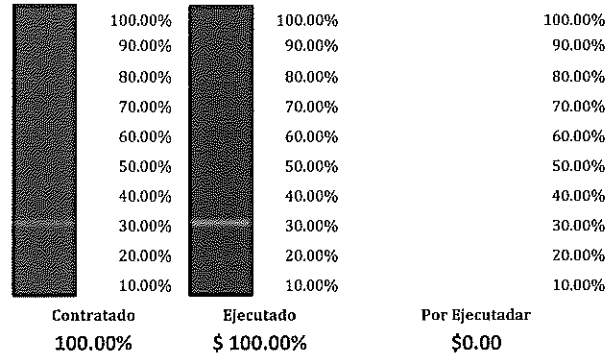

ELABORÓ:

ING. ROBERTO PEREZ GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA
