



DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBRA



Obra: "MT-DGP-2309002.-ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PÚBLICO SUBTERRANEO DE LA AV. TULUM,LADO SUR"

TULUM QUINTANA ROO A 17 DE AGOSTO DE 2022

Localidad: TULUM

CONVENIO CO-MOD-AVYE-HAT/DGOYSPM/COPLP/012/FISMDF/2022-I

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

PERIODO DE CONVENIO 20 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2022

Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/012/FISMDF/2022.



CONVENIO CO-ADI-AM-HAT/DGOYSPM/COPLP/012/FISMDF/2022-III

PERIODO DE EJECUCION DEL 20 DE MAYO DE 2022 AL 17 DE AGOSTO DE 2022

PERIODO DE CONVENIO 20 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
-------	---------	------------	-----------	--------------

A	DESMANTELAMIENTO	\$ -	\$ -	-
B	REHABILITACION DE SERVICIOS DE BAJA TENSION	\$ -	\$ -	-
C	OBRA ELECTRICA	\$ 4,356,941.58	\$ 4,356,941.58	
D	TRAMITES Y LIBRANZAS	\$ 69,691.38	\$ 69,691.38	
E	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 208,316.50	\$ 208,316.50	
F	EXTRAORDINARIOS	\$ 1,303,357.32	\$ 1,303,357.32	
AM	PRELIMINARES	\$ 22,016.26	\$ 22,016.26	
BM	MEDIA TENSION	\$ 1,099,325.73	\$ 1,099,325.73	
CM	BAJA TENSION	\$ 76,178.78	\$ 76,178.78	
DM	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 23,810.67	\$ 23,810.67	
EM	OBRA CIVIL	\$ 28,668.57	\$ 28,668.57	
	SUBTOTAL	\$ 7,188,306.78	\$ 7,188,306.78	
	16% I.V.A	\$ 1,150,129.08	\$ 1,150,129.08	
	TOTAL	\$ 8,338,435.86	\$ 8,338,435.86	

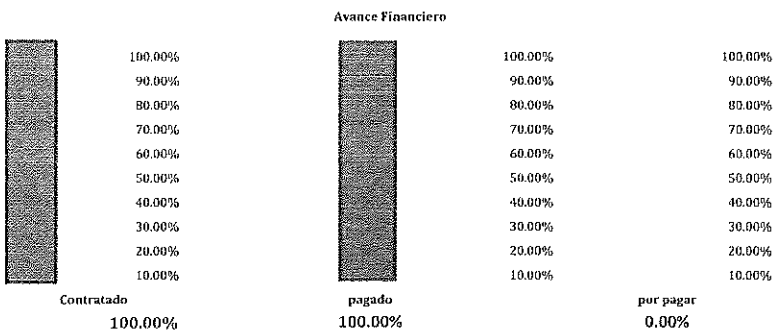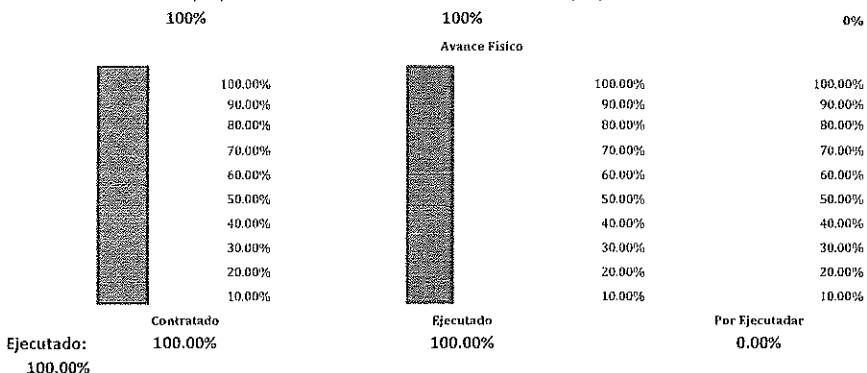

ELABORÓ:

ING. HELMER JOSUE TUZ POOT.
RESIDENTE DE OBRA
