



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
MUNICIPALES  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA**





**REPORTE FINAL DE SEGUIMIENTO DE OBRA**

OBRA: "CONSTRUCCION DE PLATAFORMA EN EL RELLENO SANITARIO PARA EL DESTINO FINAL Y TRATAMIENTO DEL SARGAZO"

Municipio: TULUM  
 NUM.Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/019/ZOFEMAT-REM/2022  
 NUM. DE CONVENIO: CO-MOD-DPA-HAT/DGOYSPM/COPLP/019/ZOFEMAT-REM/2022-1  
 PERIODO DE EJECUCION: DE 01/07/2022 AL 29/08/2022  
 PERIODO DE CONVENIO: DE 23/08/2022 AL 21/10/2022  
 TULUM QUINTANA ROO A 21 DE OCTUBRE DE 2022

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
A00-1	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO	\$107,525.00	\$107,525.00	\$0.00
A00-2	DESMONTE DE BANCO PARA DENSIDAD 80%TIPO SELVA	\$34,347.24	\$34,347.24	\$0.00
A00-3	DESPALME DE TERRENO CON MEDIOS MECANICOS	\$467,390.00	\$467,390.00	\$0.00
A00-4	EXCAVACION EN CORTE DE CEPAS EN TERRENO TIPO" C"	\$2,103,157.50	\$2,103,157.50	\$0.00
A00-5	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO CEMENTANTE	\$2,244,413.60	\$2,244,413.60	\$0.00
A00-6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL 400GR./M2	\$504,165.75	\$504,165.75	\$0.00
A00-7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA DE POLIETILENO	\$1,308,579.25	\$1,308,579.25	\$0.00
A00-8	FORMACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO	\$324,175.50	\$324,175.50	\$0.00
A00-9	ROTULO DE SEÑALAM. PUNTO DE REUNION CON PINT. DE ESMAL.	\$4,154.52	\$4,154.52	\$0.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$7,097,908.36</b>	<b>\$7,097,908.36</b>	<b>\$0.00</b>
	16% IVA	\$1,135,665.34	\$1,135,665.34	\$0.00
	<b>TOTAL 100 %</b>	<b>\$8,233,573.70</b>	<b>\$8,233,573.70</b>	<b>\$0.00</b>

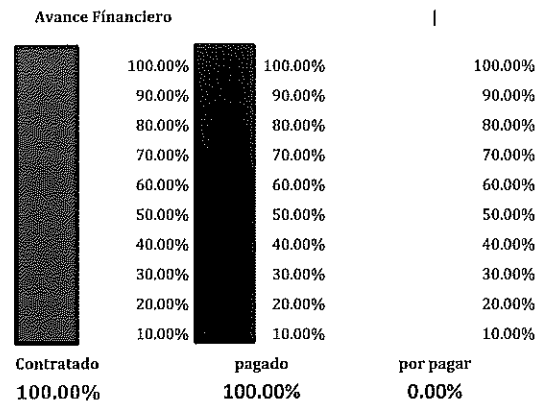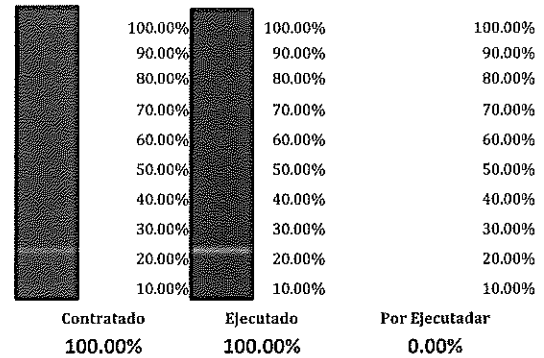

ELABORÓ:

ING. ROBERTO PEREZ GONZALEZ  
RESIDENTE DE OBRA
