



**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA  
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA  
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBRA**



Obra: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL 1ER CUADRO DE LA CIUDAD DE TULUM (SEDATU)

Localidad: TULUM


Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

PERIODO DE EJECUCION : 18 DE JULIO DE 2022 AL 15 DE OCTUBRE DE 2022


Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/021/R28/2022

TULUM QUINTANA ROO A 15 DE OCTUBRE DE 2022

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
A	MOBILIARIO URBANO	\$ 1,218,753.40	\$ 1,049,605.78	
B	SEÑALETICA HORIZONTAL	\$ 1,415,174.13	\$ 1,124,552.21	
	SEÑALETICA VERTICAL	\$ 364,381.74	\$ 364,381.74	
	EXTRAORDINARIOS		\$ 459,769.54	
		\$ 2,998,309.27	\$ 2,998,309.27	
		\$ 479,729.48	\$ 479,729.48	
		\$ 3,478,038.75	\$ 3,478,038.75	

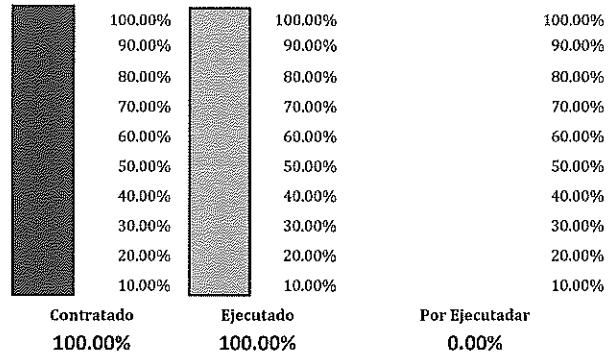

**Avance Financiero**

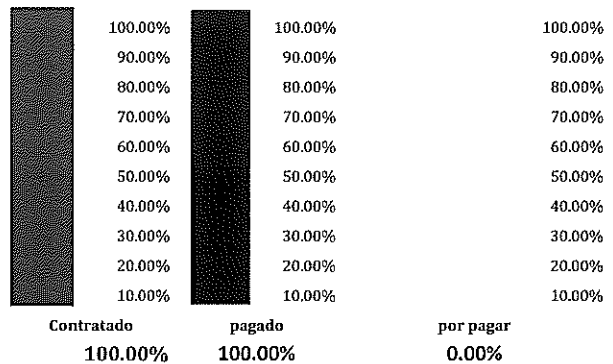

ELABORO:  
  
 ARQ. ALEJANDRO RAMIREZ CORDERO  
 RESIDENTE DE OBRA
