



**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBRA**



Obra: CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA AV.
TULUM, LADO SUR

Localidad: TULUM


Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

PERIODO DE EJECUCION : 18 DE JULIO DE 2022 AL 15 DE OCTUBRE DE 2022


Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/022/R28/2022

TULUM QUINTANA ROO A 15 DE OCTUBRE DE 2022

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
A	PRELIMINARES	\$ 793,109.06	\$ 735,759.45	
B	ANDADOR	\$ 2,080,500.32	\$ 1,268,703.99	
	EXTRAORDINARIOS		\$ 869,145.94	
		\$ 2,873,609.38	\$ 2,873,609.38	
		\$ 459,777.50	\$ 459,777.50	
		\$ 3,333,386.88	\$ 3,333,386.88	

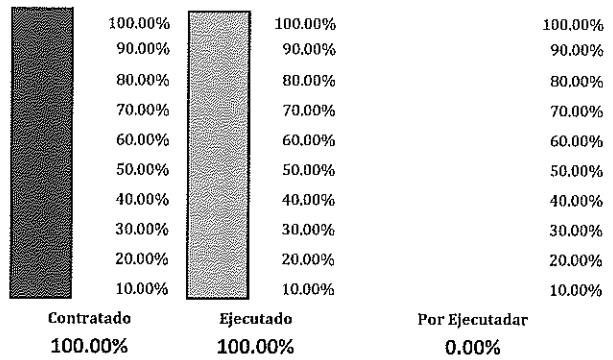

Avance Financiero

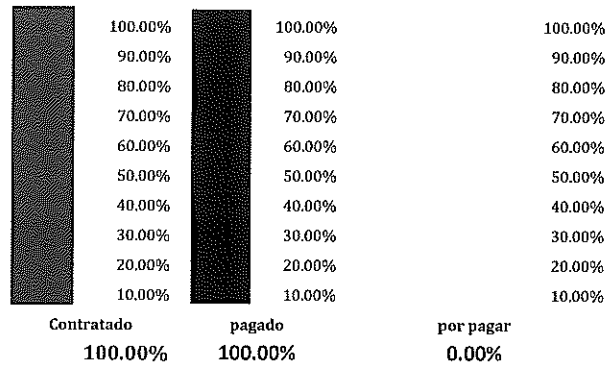

ELABORO:

ARQ. ALEJANDRO RAMIREZ CORDERO
RESIDENTE DE OBRA
