

**MUNICIPALES**  
**DIRECCION DE OBRA PUBLICA**  
**REPORTE FINAL DE SEGUIMIENTO DE OBRA**



Obra: "PAVIMENTACION DE CALLE 5 ENTRE AV. 5 NORTE Y CALLE NUM. 14 SUR COL. LA VELETA"

Localidad: TULUM


PERIODO DE EJECUCION 18/DE JULIO/2022 /AL 15/SEPTIEMBRE/2022

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO


FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/023/R-28/2022

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
A-1	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO	\$74,643.27	\$87,490.32	0
A-2	LIMPIEZA Y DESPALME EN AREA CON VEGETACION BAJA	\$47,160.95	73,749.89	0
A-3	CAJEO PARA UNIR CARPETA NUEVA CON CARPETA BIEJA	\$3,276.44	\$0.00	0
B-1	CORTE A CIELO ABIERTO EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA	\$205,473.76	273,893.49	0
B-2	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO CEMENT. CON GRAN. 1 1/2	\$747,512.33	\$662,131.80	0
B-3	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE SELECCIONADO	\$36,005.47	\$36,005.47	0
B-4	FORMACION Y COMPACTACION DE TERRACERIAS	\$186,822.22	\$167,623.47	0
C-1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACION	\$205,386.61	\$205,386.61	0
C-2	FORMACION DE CARPETA ASFALTICA DE 3 CM. DE ESPESOR	\$1,410,695.15	\$1,410,695.15	0
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$2,916,976.20</b>	<b>\$2,916,976.20</b>	<b>0</b>
	16% IVA	\$466,716.19	\$466,716.19	0
	<b>TOTAL 100 %</b>	<b>\$3,383,692.39</b>	<b>\$3,383,692.39</b>	<b>0</b>

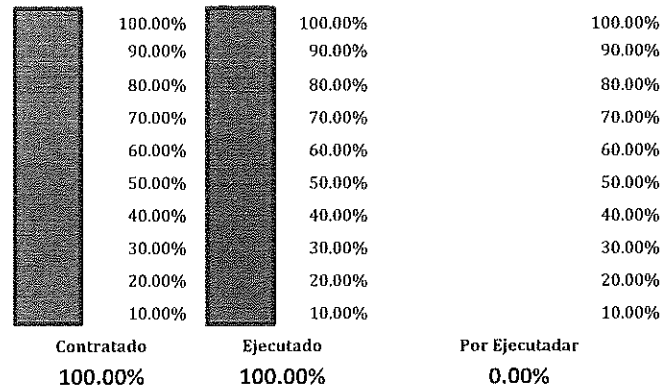

Avance Financiero

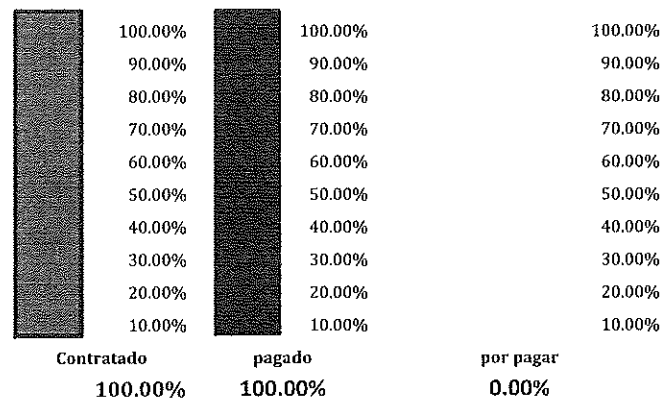

ELABORÓ:

ING. ROBERTO PEREZ GONZALEZ  
 RESIDENTE DE OBRA
