



**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBRA**



Obra: CONSTRUCCION DE MODULO DE ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE SALUD

Localidad: TULUM


PERIODO DE EJECUCION : 01 DE AGOSTO DE 2022 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO


TULUM QUINTANA ROO A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/024/R28/2022

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
A	PRELIMINARES	\$ 15,624.98	\$ 15,624.98	
B	CIMENTACION	\$ 103,575.90	\$ 103,575.90	
C	ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ALBAÑILERIA	\$ 251,454.01	\$ 251,454.01	
D	ACABADOS	\$ 215,371.05	\$ 215,371.05	
E	ALBAÑILERIA Y ACABADOS EN AZOTEA	\$ 45,258.64	\$ 45,258.64	
F	INSTALACIONES, EQUIPO Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$ 45,873.05	\$ 45,873.05	
G	NES HIDRAULICAS, SANITARIAS MUEBLES Y ACCESORIOS	\$ 29,586.81	\$ 29,586.81	
H	CARPINTERIA, CANCELERIA Y HERRERIA	\$ 19,571.46	\$ 19,571.46	
EXTRAORDINARIOS				
		\$ 119,200.88	\$ 726,315.90	
		\$ 19,072.14	\$ 116,210.54	
		\$ 138,273.02	\$ 842,526.44	

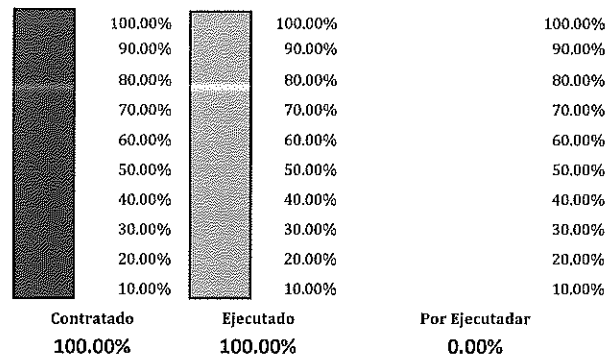

Avance Financiero

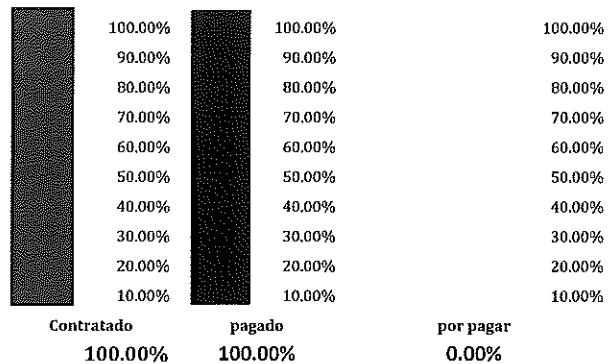

ELABORÓ:

 ARQ. ALEJANDRO RAMIREZ CORDERO
 RESIDENTE DE OBRA
