



**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBRA**



Obra: "TERMINACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA LOCALIDAD DE CHEMUYIL"

Localidad: CHEMUYIL


Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

PERIODO DE EJECUCION : 01 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022


Contrato: HAT/DGOYSPM/COP3P/027/REM-R2B/2022

TULUM QUINTANA ROO A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
A	CANCHA DE BEISBOL			
A	CANCHA DE FUTBOL	\$ 1,427,702.79	\$ 1,427,702.79	\$ -
B	GRADAS DE AFICIONADOS	\$ 185,450.49	\$ 185,450.49	\$ -
C	GRADAS DE JUGADORES	\$ 62,404.75	\$ 62,404.75	\$ -
D	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$ 31,069.07	\$ 31,069.07	\$ -
EXT	EXTRAORDINARIOS	\$ 9,222.39	\$ 9,222.39	\$ -
		\$ 1,715,849.49	\$ 1,715,849.49	\$ -
		\$ 274,535.92	\$ 274,535.92	\$ -
		\$ 1,990,385.41	\$ 1,990,385.41	\$ -

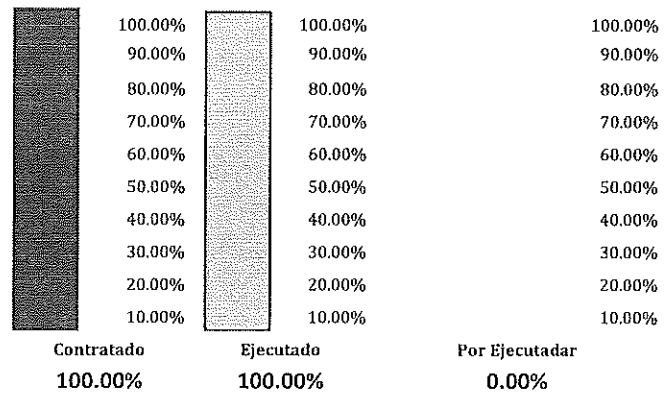

Avance Financiero

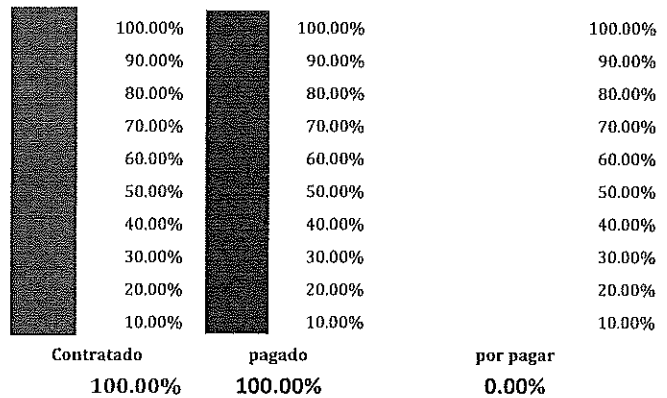

ELABORÓ:

ING. ANA VICTORIA LARA NOYA
RESIDENTE DE OBRA
