



DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBRA



Obra: "MT-DGP-2309004.-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE TULUM"

TULUM QUINTANA ROO A 17 DE OCTUBRE DE 2022

Localidad: TULUM

CONVENIO

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

PERIODO DE CONVENIO

Contrato: HAT/DGOVSPM/COPLP/029/FORTAMUNDF/2022



CONVENIO

PERIODO DE EJECUCION DEL 29 DE AGOSTO DE 2022 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2022

PERIODO DE CONVENIO

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
-------	---------	------------	-----------	--------------

A	CRUCERO AVENIDA TULUM CON CALLE KUKULKAN	\$ 1,022,029.72	\$ 1,022,029.72	
B	CRUCERO CALLE OÓ KOT, CALLE KUKULKAN	\$ 864,294.26	\$ 864,294.26	
C	CRUCERO AVENIDA COBA NORTE CON CALLE OÓ KOT	\$ 1,161,126.11	\$ 1,161,126.11	
D	CRUCERO AVENIDA SUR (SEGURIDAD PUBLICA)	\$ 875,748.06	\$ 875,748.06	
CE	EXTRAORDINARIOS	\$ 824,249.09	\$ 824,249.09	
E	CRUCERO AVENIDA COBA SUR CON CALLE ASTEROIDES ORIENTE	\$ 1,159,371.98	\$ 1,159,371.98	
F	CRUCERO CALLE OÓ KOT CON AV. SATELITE NORTE	\$ 871,047.19	\$ 871,047.19	
		\$ -	\$ -	
	SUBTOTAL	\$ 6,777,866.41	\$ 6,777,866.41	
	16% I.V.A	\$ 1,084,458.62	\$ 1,084,458.62	
	TOTAL	\$ 7,862,325.03	\$ 7,862,325.03	

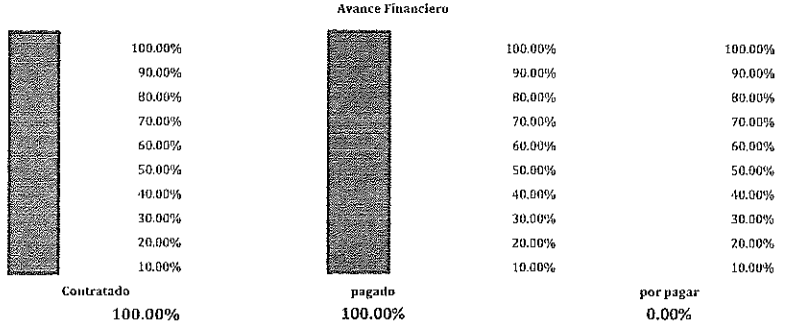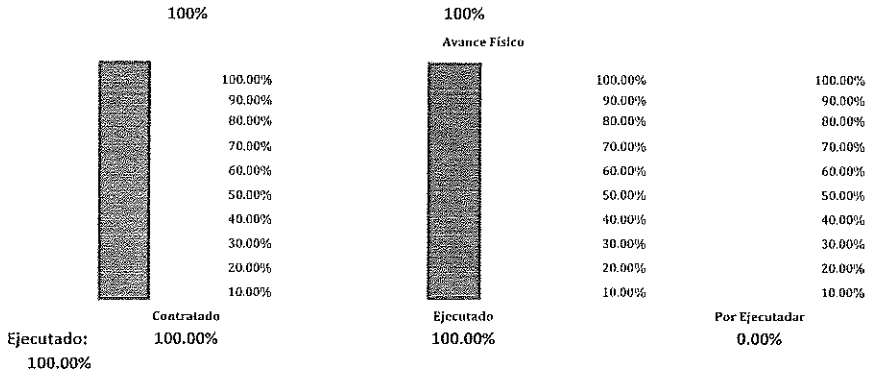

ELABORÓ:

ING. HELMER JOSUE TUZ POOT.
RESIDENTE DE OBRA
