



**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBRA**



Obra: CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA AV.
TULUM, LADO NORTE

Localidad: TULUM


Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/030/R28/2022


PERIODO DE EJECUCION : 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2022

TULUM QUINTANA ROO A 24 DE DICIEMBRE DE 2022

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
A	PRELIMINARES	\$ 374,703.31	\$ 369,403.94	
B	ANDADOR	\$ 2,203,255.32	\$ 1,750,694.35	
C	SEÑALITICA HORIZONTAL	\$ 268,766.92	\$ 239,267.37	
D	SEÑALITICA VERTICAL	\$ 28,222.51	\$ 28,222.51	
	EXTRAORDINARIOS		\$ 487,359.88	
		\$ 2,874,948.06	\$ 2,874,948.05	
		\$ 459,991.69	\$ 459,991.69	
		\$ 3,334,939.75	\$ 3,334,939.74	

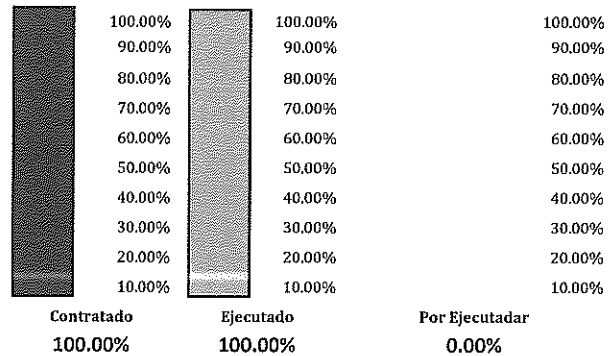

Avance Financiero

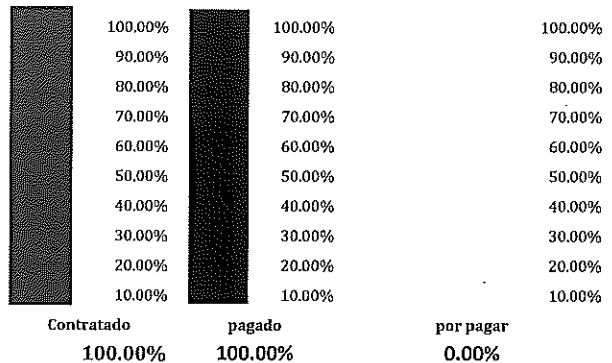

ELABORO:

ARQ. ALEJANDRO RAMIREZ CORDERO
RESIDENTE DE OBRA
