

**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA  
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA  
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBRA**



Obra: MT-DGP-2309012.- AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE AKUMAL.

Localidad: AKUMAL

PERIODO DE EJECUCION : 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2022

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO


TULUM QUINTANA ROO A 24 DE DICIEMBRE DE 2022

Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/031/FISMDF/2022

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
<b>VILLA PLANTA BAJA</b>				
1.A.1	PREELIMINARES	\$ 169,126.82677	\$ 169,126.82677	\$ -
1.A.2	CIMENTACION	\$ 210,850.85684	\$ 210,850.85684	\$ -
1.A.3	ALBAÑILERIA	\$ 301,691.57360	\$ 301,691.57360	\$ -
1.A.4	LOSAS Y ACABADOS EN AZOTÉAS	\$ 292,556.74700	\$ 292,556.74700	\$ -
1.A.5	ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	\$ 328,893.11268	\$ 328,893.11268	\$ -
1.A.6	PISOS Y RECUBRIMIENTOS	\$ 207,037.40000	\$ 207,037.40000	\$ -
1.A.7	INSTALACION ELECTRICA	\$ 290,307.76000	\$ 290,307.76000	\$ -
1.A.8	INSTALACION HIDRAULICA	\$ 21,378.14000	\$ 21,378.14000	\$ -
1.A.9	INSTALACIONES SANITARIAS Y ACCESORIOS	\$ 114,949.53000	\$ 114,949.53000	\$ -
1.A.10	PUERTAS Y VENTANAS	\$ 203,567.56340	\$ 203,567.56340	\$ -
1.A.11	CUBO DE ESCALERAS	\$ 149,471.98592	\$ 149,471.98592	\$ -
1.B.1	FACHADA	\$ 125,552.38000	\$ 125,552.38000	\$ -
1.B.2	CISTERNA	\$ 83,759.33000	\$ 83,759.33000	\$ -
EXT	EXTRAORDINARIOS	\$ 14,402.36045	\$ 14,402.36045	\$ -
		\$ 2,513,545.57	\$ 2,513,545.57	\$ -
		\$ 402,167.29	\$ 402,167.29	\$ -
		\$ 2,915,712.86	\$ 2,915,712.86	\$ -

ELABORÓ:

ING. ANA VICTORIA LARA NOYA  
RESIDENTE DE OBRA



**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA  
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA  
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBRA**



**Obra:** MT-DGP-2309012.- AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE AKUMAL.


**Localidad:** AKUMAL

**Municipio:** TULUM, QUINTANA ROO


**Contrato:** HAT/DGOYSPM/COPLP/031/FISMDF/2022

**PERIODO DE EJECUCION :** 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2022

**TULUM QUINTANA ROO A 24 DE DICIEMBRE DE 2022**

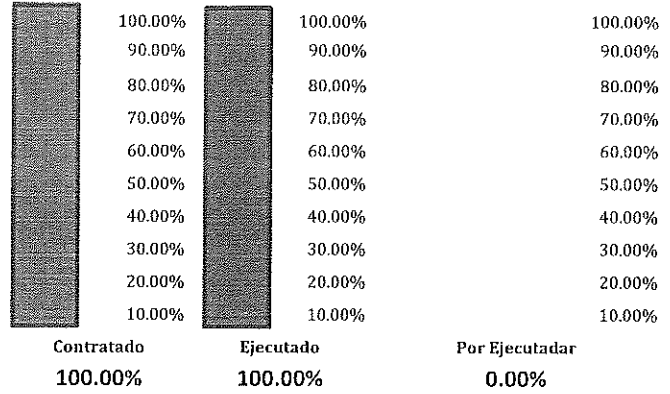

**Avance Financiero**

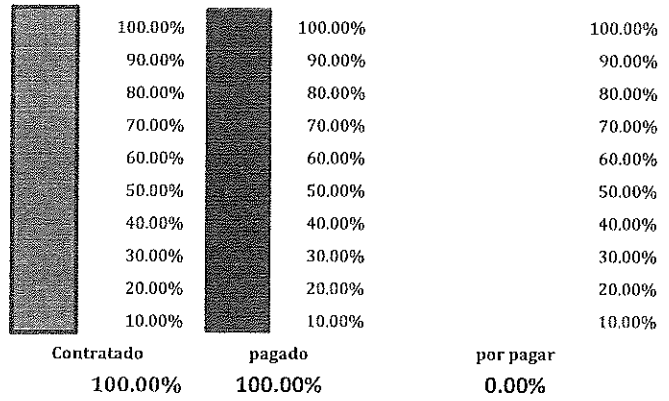

**ELABORÓ:**

**ING. ANA VICTORIA LARA NOYA  
RESIDENTE DE OBRA**
