



DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBRA



Obra: "MT-DGP-230911.-ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO SUBTERRANEO DE LA AV.TULUM,LADO NORTE"

TULUM QUINTANA ROO A 19 DE DICIEMBRE DE 2022

Localidad: TULUM

CONVENIO COM-MOD-DPA-HAT/DGOYSPM/COPLP/034/FISMDF/2022-I

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

CONVENIO COM-MOD-AyE-HAT/DGOYSPM/COPLP/034/FISMDF/2022-II

Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/034/FISMDF/2022

CONVENIO COM-ADI-AM-HAT/DGOYSPM/COPLP/034/FISMDF/2022-III



PERIODO DE EJECUCION 03 DE OCTUBRE DE 2022 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2022

PERIO DE CONVENIO

21 DE OCTUBRE DE 2022 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2022

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
-------	---------	------------	-----------	--------------

A	PRELIMINARES	\$146,540.27	\$146,540.27	
B	OBRA ELECTRICA SUBTERRANEA DE BAJA TENSION	\$1,006,470.01	\$1,006,470.01	
C	OBRA ELECTRICA SUBTERRANEA DE MEDIAN TENSION	\$4,574,442.70	\$4,574,442.70	
D	ALUMBRADO PUBLICO	\$184,048.31	\$184,048.31	
E	OBRA CIVIL	\$24,022.38	\$24,022.38	
F	TRAMITES Y LIBRANZA	\$99,522.85	\$99,522.85	
	AMPLIACION	\$1,630,885.75	\$1,630,885.75	
	SUBTOTAL	\$7,665,932.27	\$7,665,932.27	
	16% I.V.A	\$1,226,549.16	\$1,226,549.16	
	TOTAL \$	8,892,481.43	\$8,892,481.43	

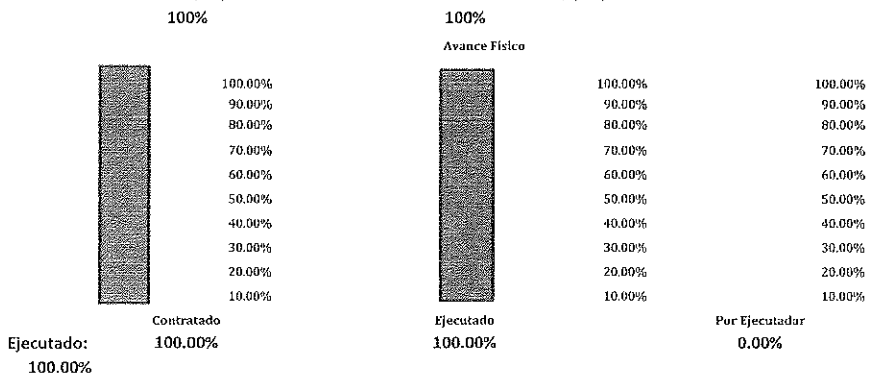

ELABORÓ:

ING. HELMER JOSUE TUZ POOT.
RESIDENTE DE OBRA
