



DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
 DIRECCION DE OBRA PUBLICA  
 REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBRA



Obra: "MT-DGP-2309005.-SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE TULUM"

TULUM QUINTANA ROO A 30 DE DICIEMBRE DE 2022

Localidad: TULUM

CONVENIO

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

PERIODO DE CONVENIO

Contrato: HAT/DGOYSPM/COP3P/035/FORTAMUNDE/2022



CONVENIO

PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022

PERIODO DE CONVENIO

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
-------	---------	------------	-----------	--------------

A	ALBAÑILERIA Y OBRA CIVIL	\$ 63,776.53	\$ 63,776.53	
B	POSTE Y COMPLEMENTOS	\$ 145,672.47	\$ 145,672.47	
C	OBRA ELECTRICA	\$ 404,624.94	\$ 404,624.94	
D	EQUIPAMIENTO	\$ 1,063,164.90	\$ 1,063,164.90	
E	EXTRAORDIARIOS	\$ 470,390.52	\$ 470,390.52	
		\$ -	\$ -	
		\$ -	\$ -	
		\$ -	\$ -	
	SUBTOTAL	\$ 2,147,629.36	\$ 2,147,629.36	
	16% I.V.A	\$ 343,620.70	\$ 343,620.70	
	TOTAL	\$ 2,491,250.06	\$ 2,491,250.06	

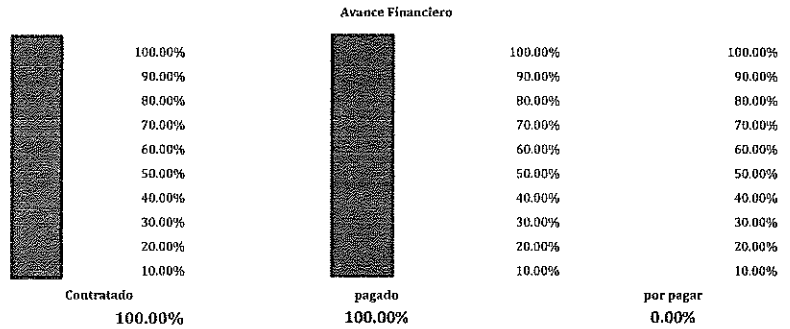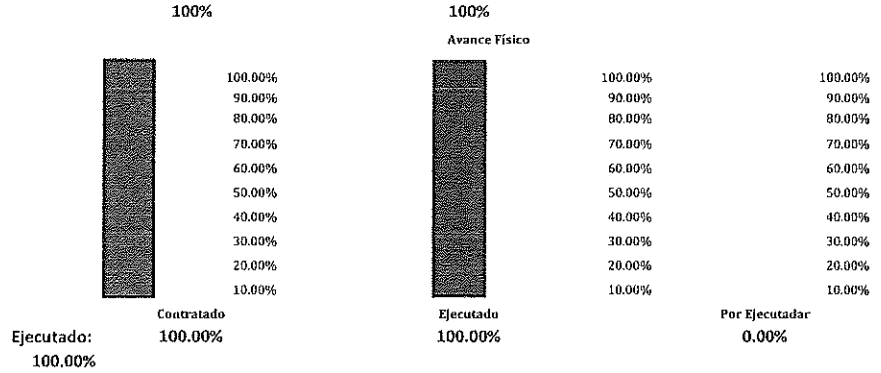

ELABORÓ:

ING. HELMER JOSUE TUZ POOT.  
 RESIDENTE DE OBRA
