

**MUNICIPALES**  
**DIRECCION DE OBRA PUBLICA**  
**REPORTE FINAL DE SEGUIMIENTO DE OBRA**



Obra: "TERMINACION DEL CIRCUITO VIAL DE LA CALLE 5 EN COLONIA LA VELETA, TULUM"

Localidad: TULUM



PERIODO DE EJECUCION 18/DE JULIO/2022 /AL 15/SEPTIEMBRE/2022

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/036/R-28/2022

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
A-1	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO	\$31,964.93	\$31,964.93	0
A-2	DESMONTE PARA UNA DENCIDAD 80% TIPO CELVA O BOSQUE	\$31,340.26	\$31,340.26	0
A-3	DESPALME DE TERRENO INCLUYE RETIRO DE MALEZA, BASURA	\$156,528.32	\$156,528.32	0
A-4	DESALOJO DE MAT. PROD. DEL DESMONTE FUERA DEL SITIO	\$42,162.46	\$42,162.46	0
A-5	ESCARIFICADO DE TERRACERIA Y PAV. EXIST. EN MAL ESTADO	\$7,484.60	\$7,484.60	0
A-6	CORTE DE MATERIAL TIPO" C "INC. CARGA Y ACARREO	\$174,437.53	\$174,473.53	0
B-1	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO CEMENTANTE	\$209,458.92	\$209,458.92	0
B-2	FORMACION Y COMPACTACION DE TERRACERIA AL 95 %	\$22,436.78	\$22,436.78	0
B-3	SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION	\$192,787.70	\$192,787.70	0
B-4	FORMACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	\$690,692.54	\$690,692.54	0
C-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA TRAFICO EN PAVIMENTO	\$186,535.57	\$186,535.57	0
D-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA ALTO	\$17,022.62	\$17,022.62	0
D-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYAS METALICAS	\$26,852.70	\$26,852.70	0
D-3	ROTULO DE FLECHA	\$15,584.76	\$15,584.76	0
D-4	ROTULO DE FLECHA COMBINADA RECTA Y BUELTA A LA DERECHA	\$ 18,704.34	\$ 18,704.34	0
D-5	ROTULO LEYENDA"MAX"EN PAVIMENTO	\$ 11,682.30	\$ 11,682.30	0
D-6	ROTULO DE NUMERO "30"EN PAVIMENTO Y VIALIDAD URBANA	\$ 10,705.38	\$ 10,705.38	0
		\$ 1,846,381.71	\$ 1,846,381.71	0
		\$ 295,421.07	\$ 295,421.07	0
		\$ 2,141,802.78	\$ 2,141,802.78	0

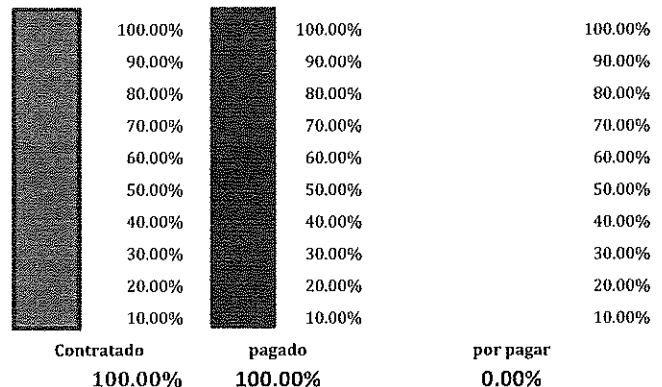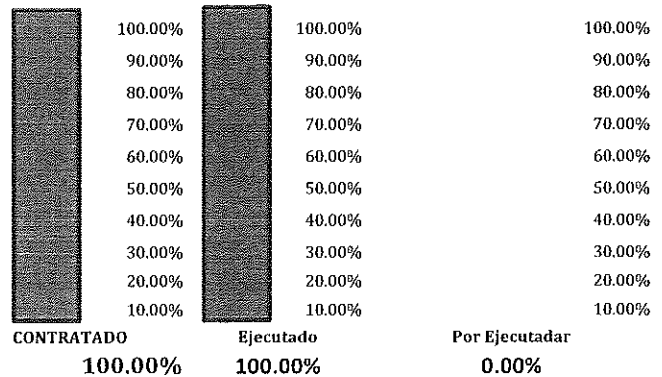

ELABORÓ:

ING. ROBERTO PEREZ GONZALEZ  
RESIDENTE DE OBRA
