



DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD



OBRA: "MT.- DGPM-2309002.- CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE SEGURIDAD PUBLICA"

TULUM

Localidad: TULUM

REPORTE

26-sep-23

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

CONTRATO: HAT/DGPI/DCyC/COP3P/FORTAMUN/006/2023

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	EJECUTADO TOTAL	POR EJECUTAR
-------	---------	------------	-----------	-----------------	--------------


"MT.- DGPM-2309002.- CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE SEGURIDAD PUBLICA"

A	TOTAL BARDA PERIMETRAL	\$1,139,548.91	\$1,139,548.91	\$1,139,548.91	
B	MODULO OFICINAS	\$597,148.14	\$597,148.14	\$597,148.14	
C	ARMERIA	\$324,685.18	\$324,685.18	\$324,685.18	
D	FOSA SEPTICA	\$90,396.35	\$90,396.35	\$90,396.35	


\$	2,151,778.58	\$	2,151,778.58	\$	2,151,778.58	\$	-
\$	2,151,778.58	\$	2,151,778.58	\$	2,151,778.58	\$	-

\$	2,151,778.58	\$	2,151,778.58	\$	2,151,778.58	\$	-
\$	344,284.57	\$	344,284.57	\$	344,284.57	\$	-
\$	2,496,063.15	\$	2,496,063.15	\$	2,496,063.15	\$	-
			100.00%		100.00%		0.00%

Avance Fisico

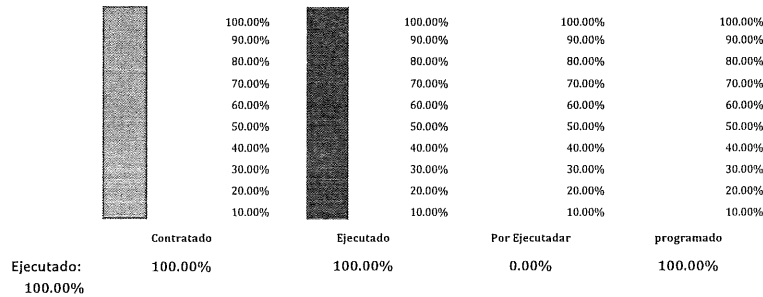

Avance Financiero

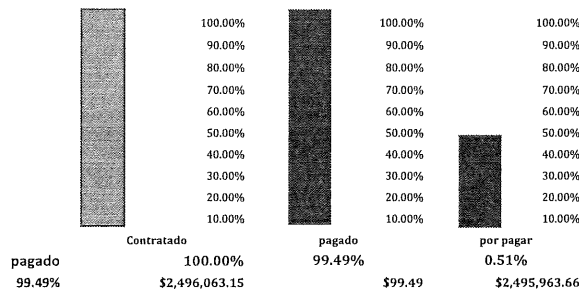

ELABORO

MANLIO CABRERA ARGAEZ
