



**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBRA**



Obra: MT-DGPM-2309002.-PAVIMENTACION DE CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHANCHEN I, 2DA ETAPA

TULUM QUINATANA ROO A 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Localidad: CHANCHEN I

PERIODO DE EJECUCION 12 DE MAYO AL 10 DE JULIO DE 2023


Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGIP/DCyC/COP3P/FAISMUN/008/2023


CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
A	PRELIMINARES	\$ 259,413.60	\$ 259,413.60	
B	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS	\$ 2,125,864.75	\$ 2,125,864.75	
C	SEÑALETICA HORIZONTAL	\$ 197,189.23	\$ 197,189.23	

SUBTOTAL \$	2,582,467.58	\$	2,582,467.58
16% I.V.A	\$413,194.81		\$413,194.81
TOTAL \$	2,995,662.39	\$	2,995,662.39
	100%		100%

Avance Físico

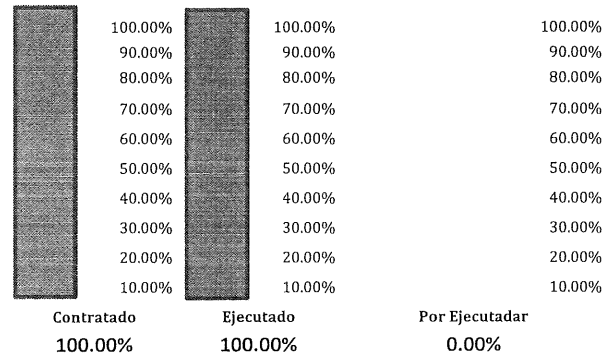

Avance Financiero

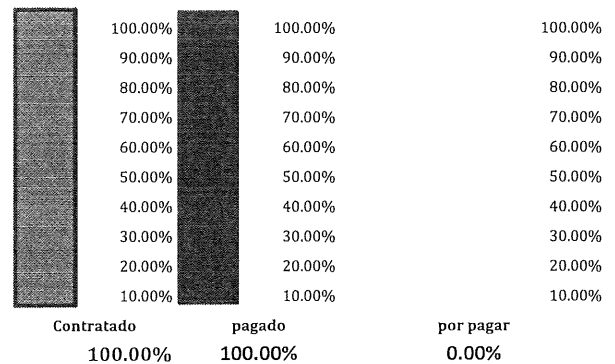

ELABORÓ:

ARQ. ALEJANDRO RAMIREZ CORDERO
RESIDENTE DE OBRA
