



DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA



Obra: OBRA: MODERNIZACION DE LA V. COBA SUR 3ERA ETAPA

Localidad: TULUM

REPORTE

26 MARZO DEL 2023


Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

CONTRATO: HAT/DGIP/DCyC/COPLP/RP/001/2024


CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	EJECUTADO TOTAL	POR EJECUTAR
	PAISAJE URBANO	\$ 905,551.11	\$ -		\$ 905,551.11
	CAMELLON CENTRAL	\$ 1,968,374.53	\$ 65,850.30	\$ 65,850.30	\$ 1,902,524.23
	JARDINERA	\$ 587,482.71			\$ 587,482.71
	CICLOVIA	\$ 3,152,204.84			\$ 3,152,204.84
	ANDADOR	\$ 3,642,135.40			\$ 3,642,135.40
	CRUCES DE ACCESO	\$ 4,692,783.78			\$ 4,692,783.78
	SEÑAL VERTICAL	\$ 80,561.77			\$ 80,561.77
	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 2,207,634.59			\$ 2,207,634.59
		\$ 17,236,728.73	\$ 65,850.30	\$ 65,850.30	\$ 17,170,878.43

	\$17,236,728.73	\$65,850.30	\$65,850.30	\$17,170,878.43
	\$17,236,728.73	\$65,850.30	\$65,850.30	\$17,170,878.43
\$	17,236,728.73	\$ 65,850.30	\$65,850.30	\$ 17,170,878.43
\$	17,236,728.73	\$ 65,850.30	\$ 65,850.30	\$ 17,170,878.43
\$	2,757,876.60	\$ 10,536.05	\$ 10,536.05	\$ 2,747,340.55
\$	19,994,605.33	\$ 76,386.35	\$ 76,386.35	\$ 19,918,218.98

Avance Físico

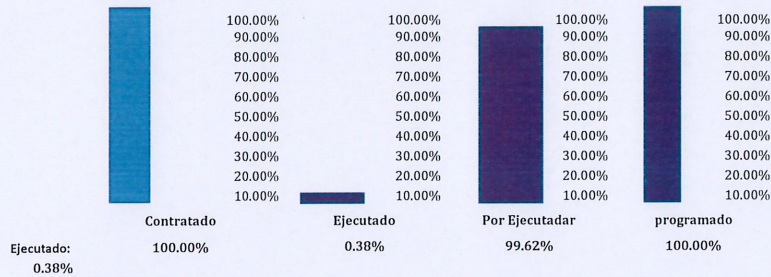

Avance Financiero

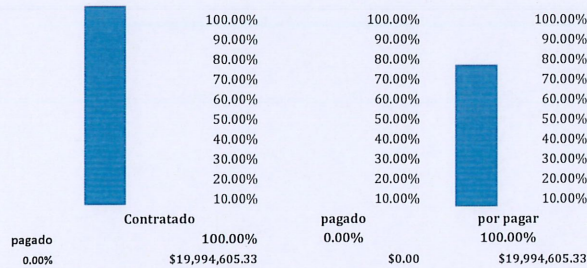

ELABORO

MANLIO CABRERA ARGÁEZ

[Handwritten signature]
