



**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA  
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA  
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBRA**



Obra: MT-DGPM-2309001.-CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMANDO,  
CONTROL, COMUNICACION Y COMPUTO DE TULUM, 1ERA ETAPA

TULUM QUINTANA ROO A 26 DE MARZO DE 2024


Localidad: TULUM

PERIODO DE EJECUCION 18 DE MARZO DE 2024 AL 14 DE AGOSTO DE 2024

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FORTAMUN-DF/RP/002/2024

| CLAVE           | PARTIDA  | CONTRATADO              | EJECUTADO    | POR EJECUTAR |
|-----------------|--|-------------------------|--------------|--------------|
| A               | OBRA CIVIL.  | \$ 24,450,364.79        |              |              |
| A.1             | PRELIMINARES   | \$ 526,145.48           |              |              |
| A.2             | CIMENTACIÓN  | \$ 2,342,259.41         |              |              |
| A.3             | ESTRUCTURAS DE CONCRETO P. BAJA                              | \$ 1,637,469.91         |              |              |
| A.4             | MUROS P. BAJA  | \$ 852,634.17           |              |              |
| A.5             | ACABADOS P. BAJA   | \$ 658,607.48           |              |              |
| A.6             | PISOS Y RECUBRIMIENTOS                                       | \$ 1,899,998.49         |              |              |
| A.7             | ESCALERA   | \$ 66,671.63            |              |              |
| A.8             | PRELIMINARES P. NIVEL  | \$ 12,229.82            |              |              |
| A.9             | ESTRUCTURAS DE CONCRETO P. NIVEL                             | \$ 1,833,895.14         |              |              |
| A.10            | MUROS P. NIVEL   | \$ 1,017,092.68         |              |              |
| A.11            | ACABADOS P. NIVEL  | \$ 748,015.35           |              |              |
| A.12            | PISOS Y RECUBRIMIENTOS P. NIVEL                              | \$ 561,328.35           |              |              |
| A.13            | AZOTEA 2N  | \$ 188,625.59           |              |              |
| A.14            | CISTERNA DE 3.00x3.00x2.50 M3 (22 M3)                        | \$ 132,562.84           |              |              |
| A.15            | ESTRUCTURA DE ACERO Y CUBIERTA MULTIPANEL                    | \$ 5,495,700.49         |              |              |
| B               | INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS E INFRAESTRUCTURA. |                         |              |              |
| B.1             | INFRAESTRUCTURA  | \$ 1,861,071.25         |              |              |
| B.2             | INSTALACION ELECTRICA CUARTO DE MÁQUINAS.                    | \$ 1,761,264.94         |              |              |
| B.3             | INSTALACION ELECTRICA EDIFICIO C4.                           |                         |              |              |
| B.3.1           | INSTALACION ELECTRICA EDIFICIO C4 P. BAJA                    | \$ 1,051,678.90         |              |              |
| B.3.2           | INSTALACION ELECTRICA EDIFICIO C4 P. NIVEL                   | \$ 880,394.46           |              |              |
| B.4             | INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y MUEBLES                         | \$ 410,228.00           |              |              |
| C               | PUERTAS Y VENTANAS   | \$ 512,490.41           |              |              |
| <b>SUBTOTAL</b> |  | <b>\$ 24,450,364.79</b> | <b>\$ -</b>  | <b>\$ -</b>  |
| 16% I.V.A       |  | \$ 3,912,058.37         |              |              |
| <b>TOTAL</b>    |  | <b>\$ 28,362,423.16</b> | <b>\$ -</b>  | <b>\$ -</b>  |
|                 |  | <b>100%</b>             | <b>0.00%</b> |              |

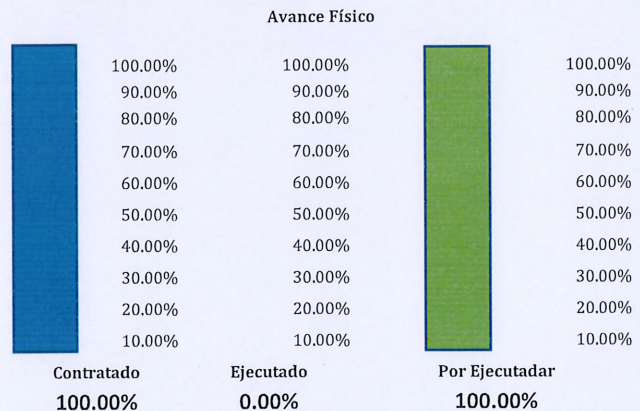

ELABORO:

ARQ. ALEJANDRO RAMIREZ CORDERO  
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA  
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA  
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBRA



Obra: MT-DGPM-2309001.-CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMANDO,  
CONTROL, COMUNICACION Y COMPUTO DE TULUM, 1ERA ETAPA

TULUM QUINATANA ROO A 26 DE MARZO DE 2024


Localidad: TULUM

PERIODO DE EJECUCION 18 DE MARZO DE 2024 AL 14 DE AGOSTO DE 2024

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FORTAMUN-DF/RP/002/2024

Avance Financiero

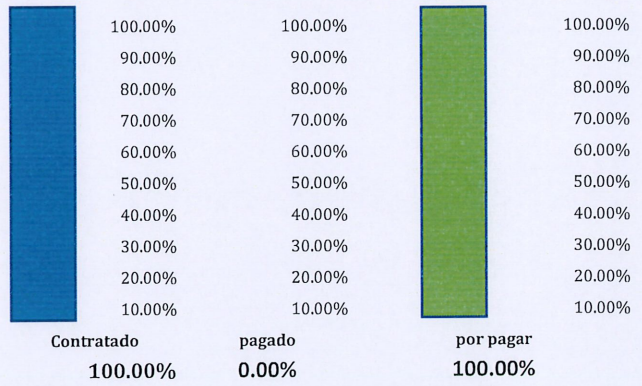

ELABORÓ:

ARQ. ALEJANDRO RAMIREZ CORDERO  
RESIDENTE DE OBRA
