



**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA  
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA  
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBRA**



Obra: MT-DGPM-2309009.-CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MACARIO GOMEZ

TULUM QUINATANA ROO A 25 DE JUNIO DE 2024

Localidad: MACARIO GOMEZ


PERIODO DE EJECUCION 20 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2024

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/012/2024

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
A	OBRA CIVIL			
A	PRELIMINARES	\$ 184,269.43	\$ 184,269.43	
B	CIMENTACIÓN	\$ 410,508.43		
C	ALBAÑILERIA	\$ 354,863.32		
D.	LOSA Y ACABADOS EN AZOTEA	\$ 725,080.58		
E.	ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	\$ 520,729.10		
F.	PISOS Y RECUBRIMIENTOS	\$ 267,218.85		
G.	INSTALACIÓN ELECTRICA	\$ 475,891.88		
H.	ALIMENTACIÓN ELECTRICA	\$ 80,489.59		
I.	INSTALACIÓN HIDRAULICA	\$ 124,493.04		
J.	INSTALACIÓN SANITARIA Y ACCESORIOS	\$ 202,720.18		
K.	CISTERNA DE 3.00x3.00x2.50 M3 (22 M3)	\$ 126,848.64		
L.	PLANTA DE TRATAMIENTO BIOTAR.	\$ 185,683.28		
M.	CANCELERIA Y HERRERIA	\$ 313,226.29		
N.	ESTACIONAMIENTO	\$ 334,293.98		
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 4,306,316.59</b>	<b>\$184,269.43</b>	
	<b>16% I.V.A</b>	<b>\$689,010.65</b>	<b>\$29,483.11</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,995,327.24</b>	<b>\$ 213,752.54</b>	
		<b>100%</b>	<b>4%</b>	

Avance Físico

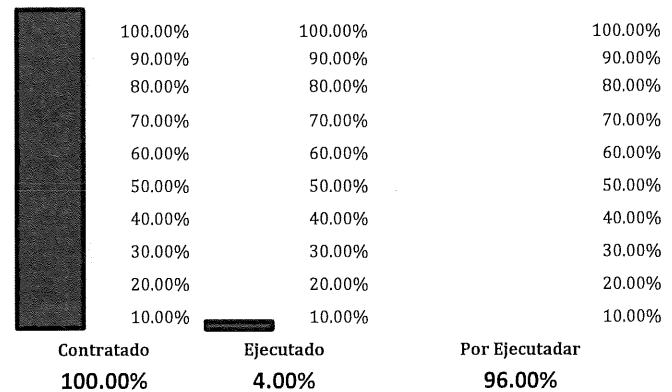

ELABORÓ:

ARQ. ALEJANDRO RAMIREZ CORDERO  
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA  
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA  
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBRA



Obra: MT-DGPM-2309009.-CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MACARIO GOMEZ


TULUM QUINATANA ROO A 25 DE JUNIO DE 2024

Localidad: MACARIO GOMEZ

PERIODO DE EJECUCION 20 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DE 2024

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/012/2024

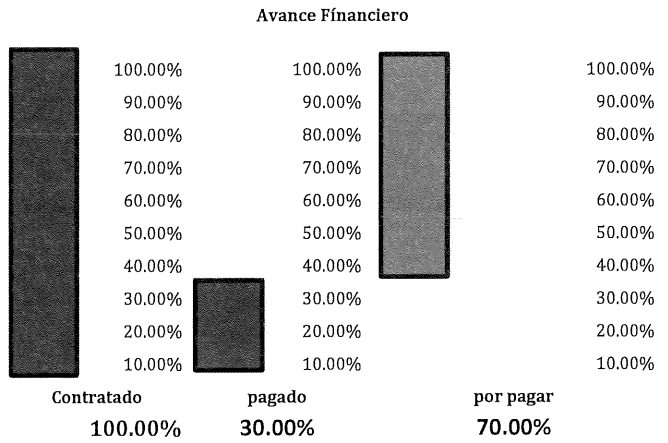

ELABORÓ:

ARQ. ALEJANDRO RAMIREZ CORDERO  
RESIDENTE DE OBRA
