



DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBRA



Obra: CONSTRUCCIÓN DE CAMELLÓN CENTRAL DE AV. LA SELVA, 1ERA ETAPA

TULUM QUINTANA ROO A 25 DE JUNIODE 2024

Localidad: TULUM

CONVENIO

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

PERIODO DE CONVENIO

Contrato: HAT/DGIP/DCyC/COPLP/R2B/015/2024

CONVENIO

PERIODO DE EJECUCION DEL 20 DE MAYO DE 2024 AL 18 DE JULIO DE 2024

PERIODO DE CONVENIO

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
-------	---------	------------	-----------	--------------


A.1	TRAZO Y NIVELACIÓN	\$ 312,268.85	\$ 103,048.72	\$ 209,220.13
A.2	CORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE	\$ 457,541.08	\$ 150,988.56	\$ 306,552.52
A.3	EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "B"	\$ 30,746.25	\$ 10,146.26	\$ 20,599.99
A.4	CONSTRUCCION DE GUARNICION RECTA (ALTA)	\$ 1,524,156.32	\$ 502,971.59	\$ 1,021,184.73
A.5	CONSTRUCCION DE GUARNICION CURVA (ALTA)	\$ 556,798.57	\$ -	\$ 556,798.57
A.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDO FIJO	\$ 463,639.04	\$ -	\$ 463,639.04
A.7	FIRME DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2	\$ 355,636.22	\$ -	\$ 355,636.22
B.1	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO	\$ 33,844.04	\$ -	\$ 33,844.04
B.2	ESCARIFICADO DE 15 CM	\$ 49,551.23	\$ -	\$ 49,551.23
B.3	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (BASE HIDRAULICA)	\$ 345,760.80	\$ -	\$ 345,760.80
B.4	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRACERÍAS AL 95%	\$ 36,380.45	\$ -	\$ 36,380.45
B.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN	\$ 74,800.68	\$ -	\$ 74,800.68
B.6	FORMACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 3 CM	\$ 498,804.08	\$ -	\$ 498,804.08
SUBTOTAL		\$ 4,739,927.61	\$ 767,155.13	\$ 3,972,772.49
16% I.V.A		\$ 758,388.42	\$ 122,744.82	\$ 635,643.60
TOTAL		\$ 5,498,316.03	\$ 889,899.95	\$ 4,608,416.08

100%


16%

84%

Avance Físico

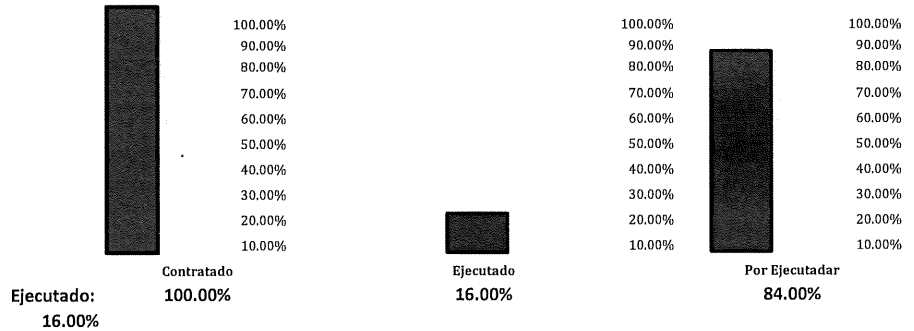

Avance Financiero

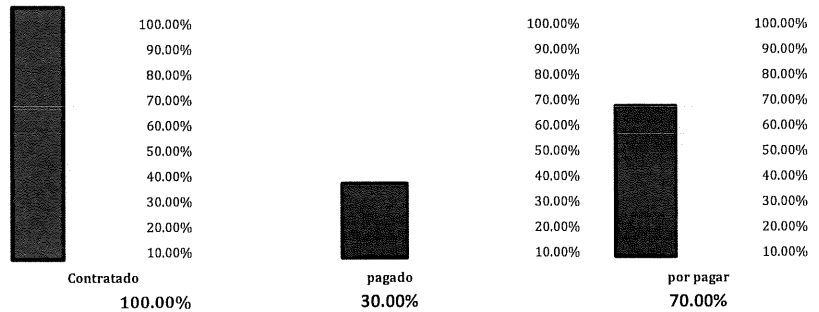

Bo As

ELABORÓ:

TEC. YAJAYRA ESTEFANIA PACHECO YAMA,
 RESIDENTE DE OBRA
