



DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBRA



Obra: MT-DGPM-2309001.-CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMANDO,
CONTROL, COMUNICACION Y COMPUTO DE TULUM, 1ERA ETAPA


TULUM QUINATANA ROO A 25 DE JUNIO DE 2024

Localidad: TULUM

PERIODO DE EJECUCION 18 DE MARZO DE 2024 AL 14 DE AGOSTO DE 2024

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FORTAMUN-DF/RP/002/2024

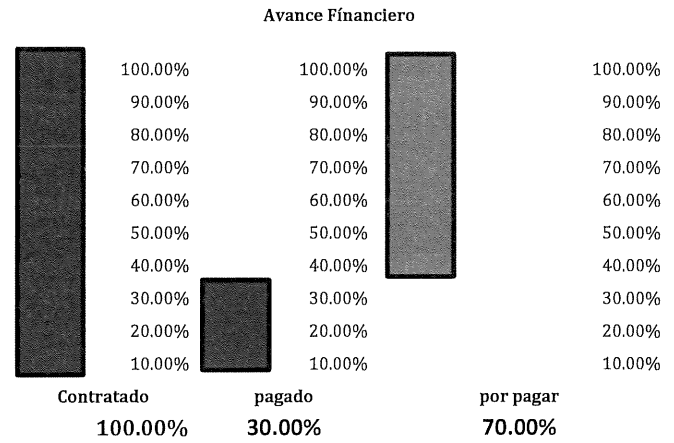

ELABORÓ:

ARQ. ALEJANDRO RAMIREZ CORDERO
RESIDENTE DE OBRA



**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBRA**



Obra: MT-DGPM-2309001.-CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMANDO,
CONTROL, COMUNICACION Y COMPUTO DE TULUM, 1ERA ETAPA

TULUM QUINATANA ROO A 25 DE JUNIO DE 2024

Localidad: TULUM

PERIODO DE EJECUCION 18 DE MARZO DE 2024 AL 14 DE AGOSTO DE 2024


Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FORTAMUN-DF/RP/002/2024

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
A	OBRA CIVIL			
A.1	PRELIMINARES	\$ 526,145.48	\$ 296,741.75	
A.2	CIMENTACION	\$ 2,342,259.41		
A.3	ESTRUCTURAS DE CONCRETO P. BAJA	\$ 1,637,469.91		
A.4	MURÓS P. BAJA	\$ 852,634.17		
A.5	ACABADOS P. BAJA	\$ 658,607.48		
A.6	PISOS Y RECUBRIMIENTOS	\$ 1,899,998.49		
A.8	ESCALERA	\$ 66,671.63		
A.9	PRELIMINARES P. NIVEL	\$ 12,229.82		
A.10	ESTRUCTURAS DE CONCRETO P. NIVEL	\$ 1,833,895.14		
A.11	MUROS P. NIVEL	\$ 1,017,092.68		
A.12	ACABADOS P. NIVEL	\$ 748,015.35		
A.13	PISOS Y RECUBRIMIENTOS NIVEL	\$ 561,328.35		
A.14	AZOTEA 2N	\$ 188,625.59		
A.15	CISTERNA DE 3.00X3.00X2.50 M3	\$ 132,562.84		
A.18	ESTRUCTURA DE CAERO Y CUBIERTA MULTIPANEL	\$ 5,495,700.49		
B	OBRA CIVIL			
B.1	INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS E INFRAESTRUCTURA	\$ 1,861,071.25		
B.2	INSTALACION ELECTRICA CUARTO DE MAQUINAS	\$ 1,761,264.94		
B.3.1	INSTALACION ELECTRICA C.4 P. BAJA	\$ 1,051,678.90		
B.3.2	INSTALACION ELECTRICA C.4 P. NIVEL	\$ 880,394.46		
B.3.4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y MUEBLES	\$ 410,228.00		
C	PUERTAS Y VENTANAS	\$ 512,490.41		

SUBTOTAL \$	24,450,364.79	\$296,741.75
16% I.V.A	\$3,912,058.37	\$47,478.68
TOTAL \$	28,362,423.16	\$ 344,220.43
	100%	1%

Avance Físico

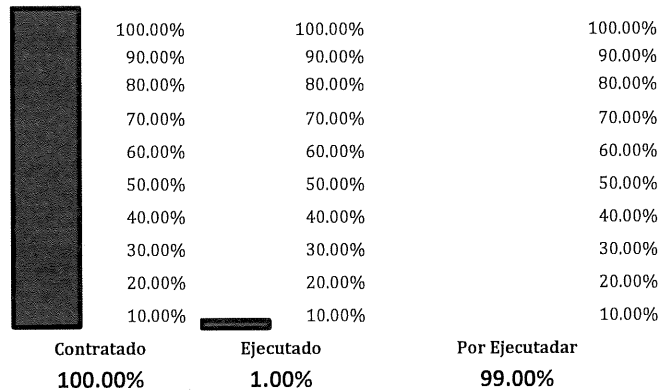

ELABORÓ:

ARQ. ALEJANDRO RAMIREZ CORDERO
RESIDENTE DE OBRA
