



**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA**



REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBRA

OBRA: "PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COLONIA LA VELETA"



NUM.DE CONTRATO: HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/003/2024

DIAS NATURALES: 90

CONTRATISTA:"SUMINISTROS, PROMOCIONES Y SUPERVISION DE OBRAS, S.A. DE C.V.

TULUM QUINTANA ROO A 24 DE JUNIO DE 2024

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
A.1.-1	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO	\$ 120,654.18	\$ 120,654.18	\$0.00
A.1.-2	DESMONTE PARA UNA DENSIDAD 80%TIPO SELVA O BOSQUE	\$ 151,633.29	\$ 151,633.29	\$0.00
A.1.-3	DESALOJO DE MATERIAL (ESCOMBRO Y DESMONTE) CON MAQ.	\$ 270,112.58	\$ 270,112.58	\$0.00
A.1.-4	CORTE EN PAVIMENTO EXISTENTE DE 3 A 8 CM. DE ESPESOR	\$ 13,754.12	\$13,754.12	\$0.00
A.1.-5	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE POSTE CON LUMINARIA	\$ 1,898.88	\$ 1,898.88	\$0.00
A.1.-6	DEMOLICION DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO DE CONCRETO	\$ 1,692.72	\$ 1,692.72	\$0.00
A.1.7	ESCARIFICADO DE 15 CM. EN AREAS DE TERRAPLEN EXISTENTE	\$ 197,865.61	\$100,000.00	\$ 97,865.61
B.1.1	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO CEMENTANTE	\$ 1,220,784.69	\$0.00	\$ 1,220,784.69
B.1.2	FORMACION Y COMPACTACION DE TERRACERIAS AL 95%	\$ 166,385.36	\$0.00	\$ 166,385.36
B.1.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACION	\$ 244,272.00	\$0.00	\$ 244,272.00
B.1.4	FORMACION DE CARPETA ASFALTICA DE 3 CM DE ESPESOR	\$ 2,404,192.71	\$0.00	\$ 2,404,192.71
C.1.1	PINTURA EN CARPETA ASFALTICA COLOR BLANCO 10CM. ANCHO	\$ 263,552.85	\$0.00	\$ 263,552.85
C.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL PREVENTIVA (SR-32) VERT." VELOCIDAD MAXIMA DE 71X71 CM. INSTALADO EN POSTE DE 2.5 MTS.	\$ 18,087.76	\$0.00	\$ 18,087.76
C.2.2	SUM.Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA(SR-6) VERTICAL DE ALTO	\$ 30,213.93	\$0.00	\$ 30,213.93
A.2.2	LIMPIEZA DE HOMBROS POR MEDIOS MECANICOS HASTA 1.00 MTS DE SOBRE ANCHO, PARA EL RETIRO DE LA CAPA VEGETAL, RECUPERACION DE CORONA EXISTENTE	\$ 55,269.90	\$0.00	\$ 55,269.90
SUBTOTAL		\$ 5,160,370.58	\$659,745.77	\$ 4,500,624.81
16% IVA		\$ 825,659.29	\$105,559.32	\$ 720,099.97
TOTAL 100 %		\$ 5,986,029.87	\$765,305.09	\$ 5,220,724.78

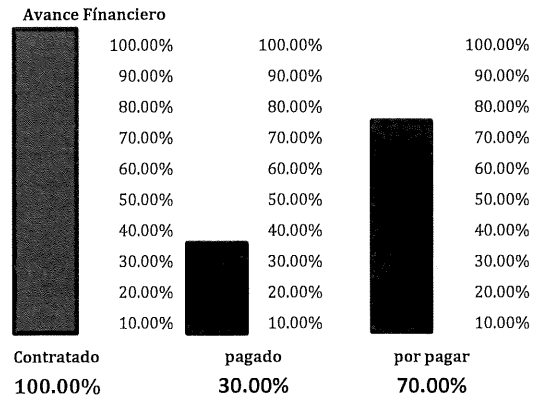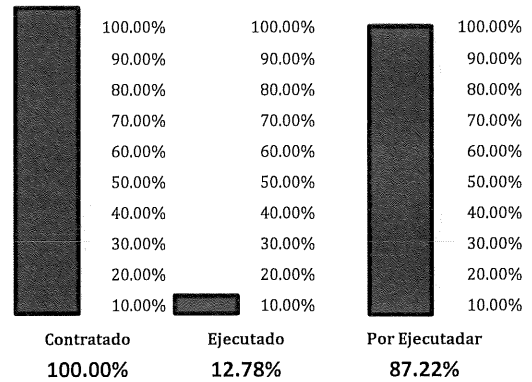

[Handwritten signature]
R.P.G.
