



**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBRA**



Obra: MT-DGPM-2309003.- ALUMBRADO PÚBLICO DE LA AV. LA SELVA, 1ERA ETAPA

Localidad: TULUM, QUINTANA ROO


Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

PERIODO DE EJECUCION : 23 DE ABRIL AL 21 DE JULIO DE 2024


Contrato: HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/004/2024

TULUM QUINTANA ROO A 24 DE JUNIO DE 2024

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
PRELIMINARES				
A.	PRELIMINARES	\$ 181,415.21000	\$ 36,283.04200	\$ 145,132.16800
B	RED DE ALUMBRADO PÚBLICO SUBTERRANEO	\$ 6,707,691.83000	\$ 335,384.59150	\$ 6,372,307.23850
		\$ 6,889,107.04	\$ 371,667.63	\$ 6,517,439.410
		\$ 1,102,257.13	\$ 59,466.82	\$ 1,042,790.31
		\$ 7,991,364.17	\$ 431,134.45	\$ 7,560,229.720

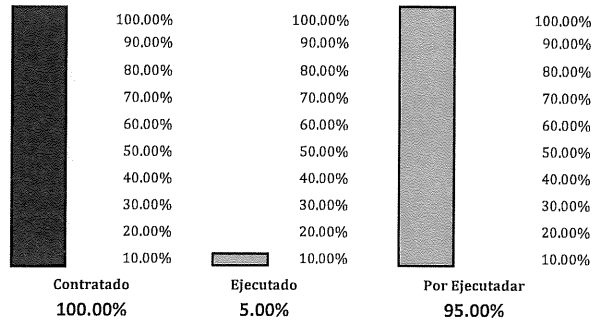

Avance Financiero

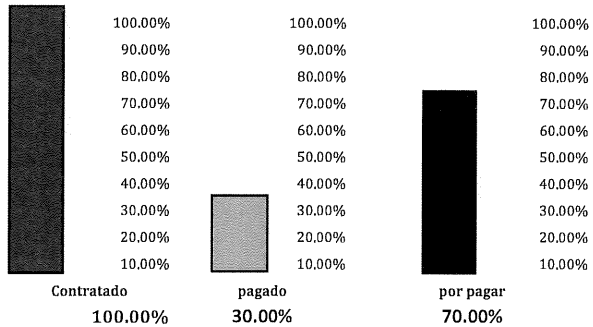

ELABORÓ:

ING. ANA VICTORIA LARA NOYA
RESIDENTE DE OBRA
