



**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBRA**



Obra: **MT- DGPM-2309005.- REHABILITACIÓN Y
AMPLIACIÓN DE CASA DE SALUD DE CHEMUYIL**

Localidad: **CHEMUYIL, QUINTANA ROO**

Municipio: **TULUM, QUINTANA ROO**

PERIODO DE EJECUCION: **02 DE MAYO AL 30 DE JULIO DE 2024**

Contrato: **HAT/DGIP/DCyC/COP3P/FAISMUN/007/2024**

TULUM QUINTANA ROO A 24 DE JUNIO DE 2024

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
PRELIMINARES				
I.	OBRA REHABILITACIÓN			
A	PRELIMINARES	\$ 200,333.12000	\$ 180,299.80800	\$ 20,033.31200
1.A.2.	LOSAS Y ACABADOS EN AZOTEA	\$ 82,668.89000	\$ -	\$ 82,668.89000
1.A.3.	ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	\$ 107,640.81000	\$ -	\$ 107,640.81000
1.A.4.	PISOS Y RECUBRIMIENTOS	\$ 95,767.25000	\$ -	\$ 95,767.25000
1.A.5.	INSTALACION ELÉCTRICA	\$ 232,785.25000	\$ -	\$ 232,785.25000
1.A.6.	INSTALACIÓN HIDRÁULICA	\$ 83,044.89000	\$ -	\$ 83,044.89000
1.A.7.	INSTALACIÓN SANITARIA Y ACCESORIOS	\$ 87,168.91000	\$ -	\$ 87,168.91000
1.A.8.	CARPINTERIA, CANCELERIA Y ACCESORIOS	\$ 43,158.33000	\$ -	\$ 43,158.33000
B	OBRA DE AMPLIACIÓN			
1.B.1.	PRELIMINARES	\$ 14,356.23000	\$ 14,356.23000	\$ -
1.B.2.	CIMENTACIÓN	\$ 321,774.86000	\$ 257,419.88800	\$ 64,354.97200
1.B.3.	ALBAÑILERIA	\$ 183,113.04000	\$ 164,801.73600	\$ 18,311.30400
1.B.4.	LOSAS Y ACABADOS EN AZOTEA	\$ 283,332.68000	\$ -	\$ 283,332.68000
1.B.5.	ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	\$ 230,321.84000	\$ -	\$ 230,321.84000
1.B.6.	PISOS Y RECUBRIMIENTOS	\$ 96,710.61000	\$ -	\$ 96,710.61000
1.B.7.	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$ 142,152.63000	\$ -	\$ 142,152.63000
1.B.8.	INSTALACIÓN HIDRAULICA	\$ 6,053.93000	\$ -	\$ 6,053.93000
1.B.9.	INSTALACIÓN SANITARIA	\$ 41,166.75000	\$ -	\$ 41,166.75000
1.B.10.	CARPINTERIA, CANCELERIA Y HERRERIA	\$ 194,250.44000	\$ -	\$ 194,250.44000
1.B.11.	ESTACIONAMIENTO	\$ 130,165.44000	\$ -	\$ 130,165.44000
		\$ 2,575,965.90	\$ 616,877.66	\$ 210,343.010
		\$ 412,154.54	\$ 98,700.43	\$ 33,654.88
		\$ 2,988,120.44	\$ 715,578.09	\$ 243,997.890

ELABORÓ:

[Firma]
ING. ANA VICTORIA LARA NOYA
RESIDENTE DE OBRA



**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBRA**



Obra: MT-DGPM-2309005.- REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CASA DE SALUD DE CHEMUYIL


Localidad: CHEMUYIL, QUINTANA ROO

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO


Contrato: HAT/DGIP/DCyC/COP3P/FAISMUN/007/2024

PERIODO DE EJECUCION: 02 DE MAYO AL 30 DE JULIO DE 2024

TULUM QUINTANA ROO A 24 DE JUNIO DE 2024

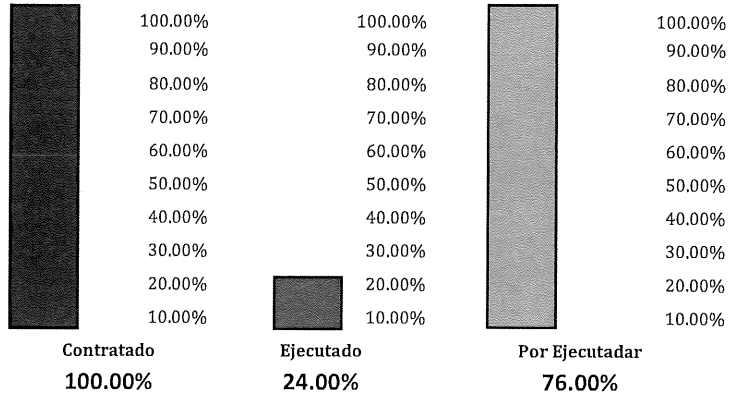

Avance Financiero

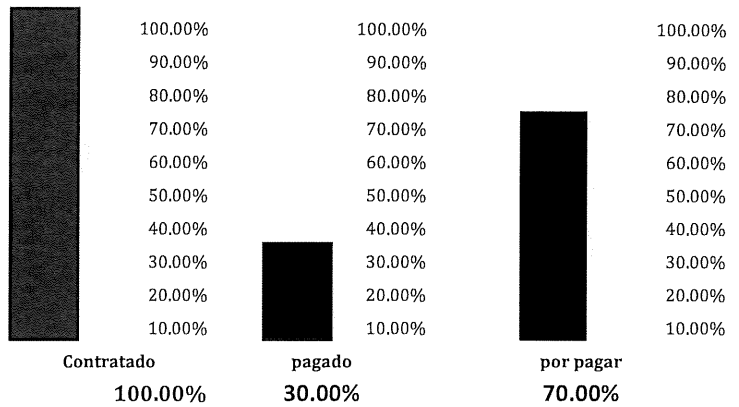

ELABORÓ:

ING. ANA VICTORIA LARA NOYA
RESIDENTE DE OBRA
