



**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA**



REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBRA



OBRA: "PAVIMENTACION DE CALLES PARA ACCESO A UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULUM, COL. CRISTAL"

NUM.DE CONTRATO: HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FAISMUN/009/2024
CONTRATISTA: IVAN CERVERA MIS

DIAS NATURALES: 90
TULUM QUINTANA ROO A 24 DE JUNIO DE 2024

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
A.1.-1	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO	\$ 59,139.19	\$ 59,139.19	\$ 0.00
A.1.-2	DESMONTE PARA UNA DENSIDAD 80%TIPO SELVA O BOSQUE	\$ 50,455.60	\$ 50,455.60	\$ 0.00
A.1.-3	DESALOJO DE MATERIAL (ESCOMBRO Y DESMONTE) CON MAQ.	\$ 186,527.41	\$ 186,527.41	\$ 0.00
A.1.-4	ESCARIFICADO DE 15 CM. EN AREAS DE TERRAPLEN EXISTENTE	\$ 52,015.05	\$ 52,015.05	\$ 0.00
A.1.-5	CORTE DE MATERIAL TIPO "C" POR MEDIOS MECANICOS	\$ 27,219.24	\$ 27,219.24	\$ 0.00
A.1.-6	PERFILAMIENTO DE JUNTA TRANSVERSAL	\$ 2,869.93	\$ 2,869.93	\$ 0.00
B.1.1	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO CEMENTANTE	\$ 585,986.04	\$ 556,686.74	\$ 29,299.30
B.1.2	FORMACION Y COMPACTACION DE TERRACERIAS AL 95%	\$ 1,220,784.69	\$ 0.00	\$ 1,220,784.69
B.1.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACION	\$ 116,689.04	\$ 0.00	\$ 116,689.04
B.1.4	FORMACION DE CARPETA ASFALTICA DE 3 CM DE ESPESOR	\$ 1,040,217.01	\$ 0.00	\$ 1,040,217.01
C.1.1	PINTURA EN CARPETA ASFALTICA COLOR BLANCO 10CM. ANCHO	\$ 276,520.00	\$ 0.00	\$ 276,520.00
D.1.1	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO EN GUARNICION Y B.	\$ 15,760.80	\$ 0.00	\$ 15,760.80
D.1.2	EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B"	\$ 1,887.23	\$ 0.00	\$ 1,887.23
D.1.3	SUMINISTRO Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN BANQUETAS	\$ 64,360.07	\$ 0.00	\$ 64,360.07
D.1.4	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO	\$ 324,966.80	\$ 0.00	\$ 324,966.80
D.1.5	FORJADO DE RAMPA DE 1.5 X 1.5 MTS.	\$ 4,120.80	\$ 0.00	\$ 4,120.80
D.1.7	CONSTRUCCION DE GUARNICION RECTA(ALTA)	\$ 84,592.20	\$ 0.00	\$ 84,592.20
D.1.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO	\$ 28,338.20	\$ 0.00	\$ 28,338.20

SUB TOTAL	\$ 3,012,520.13	\$ 934,913.16	\$ 2,077,606.97
16% IVA	\$ 482,003.22	\$ 149,586.11	\$ 332,417.11
TOTAL	\$ 3,494,523.35	\$ 1,084,499.27	\$ 2,410,024.08

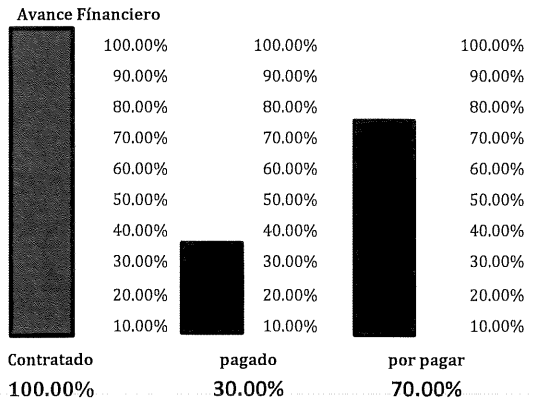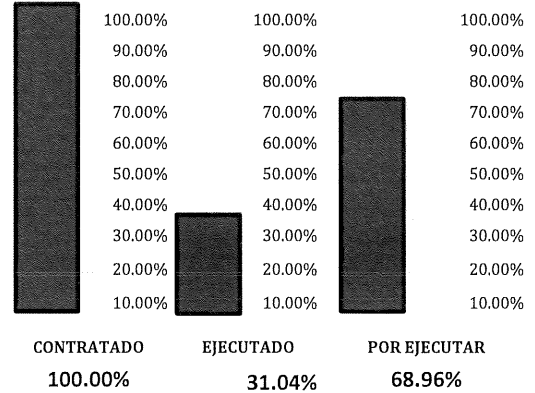

R.P.G.
