



DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD



Obra: ..IT-2309001.-CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA MATILDE MONTOYA LAFRAGUA EN LA LOCALIDAD DE CHEMUYIL"

Localidad: TULUM


Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGOYSPM/COP3P/004/FISMDF/2020


REPORTE

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
A	TOTAL PRELIMINAR	\$ 3,837.68		\$ 3,837.68
B	TOTAL CIMENTACION.	\$ 128,468.53		\$ 128,468.53
C	TOTAL ALBAÑILERIA	\$ 165,488.66		\$ 165,488.66
D	TOTAL ESTRUCTURA DE CONCRETO	\$ 210,413.05		\$ 210,413.05
E	TOTAL ALBAÑILERIA DE AZOTEA	\$ 92,433.49		\$ 92,433.49
F	TOTAL ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	\$ 197,560.77		\$ 197,560.77
G	TOTAL INSTALACION HIDRAULICA	\$ 6,881.65		\$ 6,881.65
H	TOTAL INSTALACION SANITARIA	\$ 92,622.03		\$ 92,622.03
I	TOTAL INSTALACION ELECTRICA EDIFICIO	\$ 126,018.59		\$ 126,018.59
J	TOTAL DE INSTALACION DE GAS	\$ 22,393.30		\$ 22,393.30
K	TOTAL CARPINTERÍA, CANCELERÍA Y HERRERÍA	\$ 150,796.38		\$ 150,796.38
L	TOTAL AREA VERDE	\$ 71,171.46		\$ 71,171.46
M	TOTAL RAMPA Y PASILLOS	\$ 30,431.53		\$ 30,431.53
N	TOTAL MOBILIARIO	\$ 59,686.92		\$ 59,686.92
		\$ 1,358,204.04		\$ 1,358,204.04
		\$ 217,312.65		\$ 217,312.65
		\$ 217,312.65		\$ 217,312.65

Avance Físico

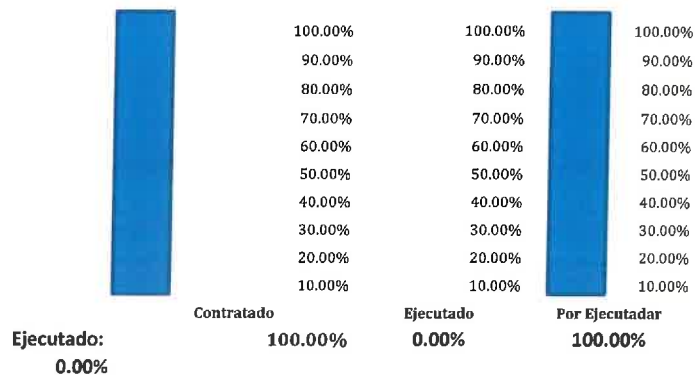

Avance Financiero

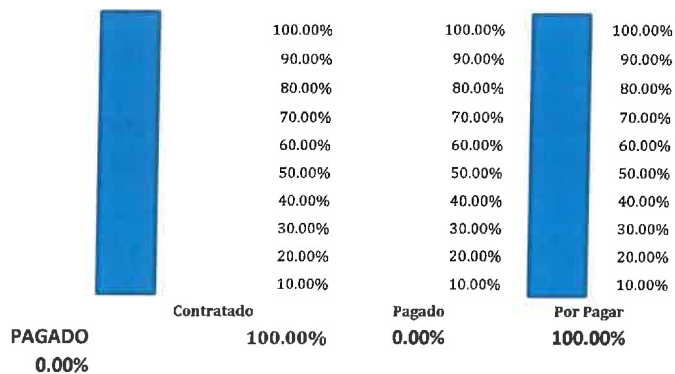

ELABORÓ

C. ROGER VALENTIN PAT POOT
RESIDENTE DE OBRA
