



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
MUNICIPALES  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA  
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD**



Obra: "MT-2309002.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA KULKA (TERCERA ETAPA)".

Localidad: TULUM

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

TULUM A 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Contrato: HAT/DOYSPM/COPLF/006/FISMDV/2020.


TERCER REPORTE

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
-------	---------	------------	-----------	--------------


**I CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE**

A	PRELIMINARES	\$ 160,519.35	\$ 160,519.35	
B	EXCAVACIÓN	\$ 2,105,387.70	\$ 2,105,387.70	
C	PLANTILLAS	\$ 44,498.16	\$ 44,498.16	
D	RELLENOS	\$ 928,137.82	\$ 928,137.82	
E	SUMINISTRO DE TUBERIAS	\$ 736,891.16	\$ 736,891.16	
F	INSTALACIÓN DE TUBERIAS	\$ 387,210.65	\$ 387,210.65	
G	SUMINISTRO DE POZOS DE VISTA	\$ 107,636.69	\$ 107,636.69	
H	INSTALACION DE POZOS DE VISTA	\$ 111,409.21	\$ 111,409.21	
J	SUMINISTRO DE MANGAS DE EMPOTRAMIENTO	\$ 14,160.68	\$ 14,160.68	
K	INSTALACIÓN DE MANGAS DE EMPOTRAMIENTO	\$ 25,132.44	\$ 25,132.44	
L	DESCARGAS SANITARIAS	\$ 813,710.83	\$ 813,710.83	
M	COMPLEMENTARIOS	\$ 1,867,375.06	\$ 1,738,569.82	
N	BANQUETA	\$ 22,612.93		
EX	EXTRAORDINARIOS	\$ 209,097.15	0	
		<b>\$ 7,312,028.96</b>	<b>\$ 7,183,263.73</b>	<b>\$ -</b>
		<b>\$ 1,169,924.63</b>	<b>98.24%</b>	<b>0.00%</b>
		<b>\$ 3,491,953.58</b>		

Avance Físico

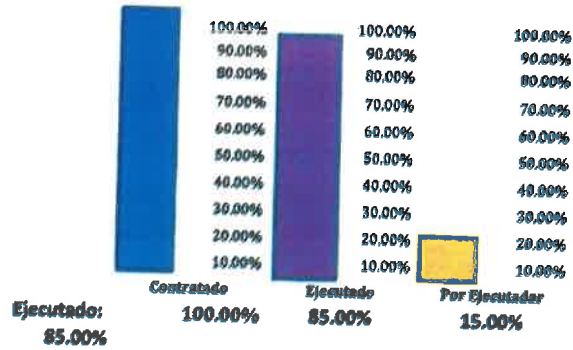

Avance Financiero

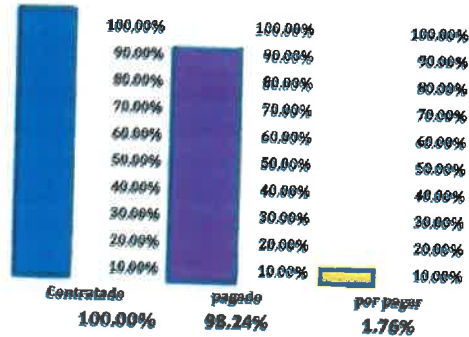

ELABORO:

**P. ING. CARLOS ALBERTO AVILA OSORIO.**  
RESIDENTE DE OBRA
