



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD**



Obra: PAVIMENTACIÓN DE LA ZONA COSTERA

Localidad: TULUM

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/047/RP/2018

PRIMER REPORTE


CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
-------	---------	------------	-----------	--------------

I PAVIMENTACION ZONA COSTERA

1.00	TERRACERIA	\$ 620,530.97	\$ 620,530.97	0.00
2.00	PAVIMENTACION	\$ 1,781,060.99	\$ 1,308,717.60	472,343.39

\$ 2,401,591.96	\$ 1,929,248.57	\$ 472,343.39
\$ 384,254.71	80.33%	19.67%
\$ 2,785,846.66		

Avance Físico

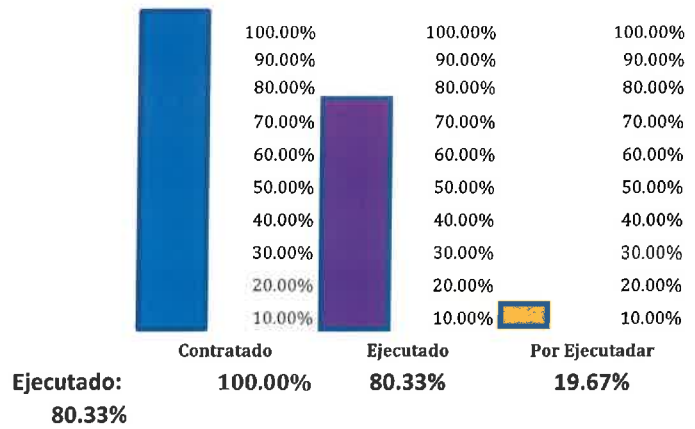

ELABORO:

P.ING. CARLOS ALBERTO AVILA OSORIO.
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS.



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD**



Obra: PAVIMENTACIÓN DE LA ZONA COSTERA

Localidad: TULUM

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/047/RP/2018

SEGUNDO REPORTE


CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
-------	---------	------------	-----------	--------------

I PAVIMENTACION ZONA COSTERA

1.00	TERRACERIA	\$ 620,530.97	620,530.97	
2.00	PAVIMENTACION	\$ 1,781,060.99	\$ 1,781,060.99	0.00

\$	2,401,591.96	\$	2,401,591.96	\$	-
\$	384,254.71	100.00%		0.00%	
\$	2,785,846.66				

Avance Físico

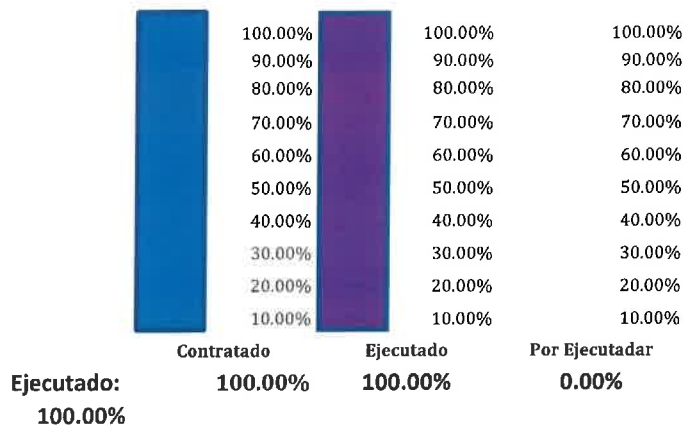

ELABORO:

P.ING. CARLOS ALBERTO AVILA OSORIO.
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS.
