



49

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 DIRECCION DE OBRA PUBLICA
 COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD



Obra: "AMPLIACION Y REMODELACION DEL PARQUE DOS AGUAS"


Localidad: TULUM

Municipio: TULUM

Contrato:

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE FALTANTE	PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL
AMPLIACION Y REMODELACION DEL PARQUE DOS AGUAS							
A	PRELIMINARES	\$ 75,100.45	\$ 74,473.94	\$ 626.51	3.04	0.03	3.07
B	ALBAÑILERIA	\$ 32,492.41	\$ 32,492.41	\$ -	1.33	-	1.33
C	PASTO SINTETICO Y JUEGOS INFANTILES	\$ 931,633.82	\$ 931,633.82	\$ -	38.02	-	38.02
D	SISTEMA ELECTRICO	\$ 305,141.23	\$ 305,141.23	\$ -	12.45	-	12.45
E	MOBILIARIO URBANO	\$ 136,751.21	\$ 136,751.21	\$ -	5.58	-	5.58
F	RAMPAS	\$ 6,900.62	\$ 6,083.83	\$ 816.79	0.25	0.03	0.28
G	JARDINERIA	\$ 557,386.58	\$ 351,245.88	\$ 206,140.62	14.33	8.41	22.74
H	SISTEMA HIDRAULICO	\$ 3,195.20		\$ 3,195.20	0	0.13	0.13
I	OBRA EXTERIOR	\$ 402,023.93		\$ 402,023.93	0	16.40	16.40
		\$ 2,450,625.37	\$ 1,837,822.32	\$ 612,803.05	75.00	75.00	100.00

REPORTE DE AVANCE FISICO ESTIMACION 01 (UNO)

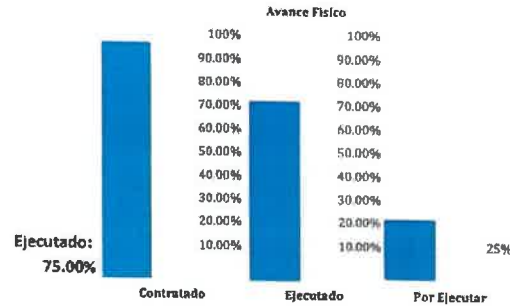

000916



DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD



Obra: "AMPLIACION Y REMODELACION DEL PARQUE DOS AGUAS"
 Localidad: TULUM
 Municipio: TULUM
 Contrato:

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO ANTERIOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	PORCENTAJE DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE FALTANTE	PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL
AMPLIACION Y REMODELACION DEL PARQUE DOS AGUAS									
A	PRELIMINARES	\$ 75,100.45	\$ 74,473.94	\$ 626.51	\$ -	3.04	0.03	-	3.07
B	ALBAÑILERIA	\$ 32,492.41	\$ 32,492.41	\$ -	\$ -	1.33	0.00	-	1.33
C	PASTO SINTETICO Y JUEGOS INFANTILES	\$ 931,633.82	\$ 931,633.82	\$ -	\$ -	38.02	0.00	-	38.02
D	SISTEMA ELECTRICO	\$ 305,141.23	\$ 305,141.23	\$ -	\$ -	12.43	0.00	-	12.43
E	MOBILIARIO URBANO	\$ 136,751.21	\$ 136,751.21	\$ -	\$ -	5.58	0.00	-	5.58
F	RAMPAS	\$ 6,900.62	\$ 6,083.83	\$ 816.79	\$ -	0.25	0.03	-	0.28
G	JARDINERIA	\$ 557,386.50	\$ 351,245.88	\$ 206,140.62	\$ -	14.33	8.41	-	22.74
H	SISTEMA HIDRAULICO	\$ 3,195.20	\$ -	\$ 3,195.20	\$ -	0	0.13	-	0.13
I	OBRA EXTERIOR	\$ 402,023.93	\$ -	\$ 402,023.93	\$ -	0	16.40	-	16.40
		\$ 2,450,625.37	\$ 1,837,822.32	\$ 612,803.05	\$ -	75.00	25.00	-	100.00

REPORTE DE AVANCE FISICO ESTIMACION 02 (DOS) FINQUITO



000993
