



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD**



Obra: MT-2309007.-CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN LA LOCALIDAD DE COBA

Localidad: TULUM

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/050/DUZA/2018


PRIMER REPORTE

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
-------	---------	------------	-----------	--------------

I	CONSTRUCCION DE CICLOVIA			
A	CIMENTACION	\$ 411,414.18	\$ 411,414.18	\$ -
B	ANDADOR DE CONCRETO	\$ 199,149.01	\$ 199,149.01	\$ -
C	PINTURA	\$ 23,095.68	\$ -	\$ 23,095.68
D	ANDADOR DE MADERA	\$ 303,643.36	\$ 46,276.72	\$ 257,366.64

\$	937,302.23	\$	656,839.91	\$	280,462.32
\$	149,968.36	70.08%	29.92%		
\$	1,087,270.59				

Avance Físico

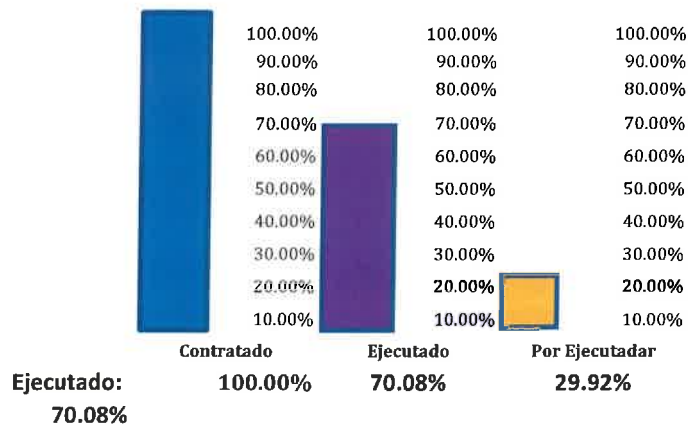

ELABORO:

P.ING. CARLOS ALBERTO AVILA OSORIO.
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS.



DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MUNICIPALES

DIRECCION DE OBRA PUBLICA

COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD



Obra: MT-2309007.-CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN LA LOCALIDAD DE COBA

Localidad: TULUM

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/050/DUZA/2018


SEGUNDO REPORTE

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
-------	---------	------------	-----------	--------------

I	CONSTRUCCION DE CICLOVIA			
A	CIMENTACION	\$ 411,414.18	\$ 411,414.18	\$ -
B	ANDADOR DE CONCRETO	\$ 199,149.01	\$ 199,149.01	\$ -
C	PINTURA	\$ 23,095.68	\$ 23,095.68	\$ -
D	ANDADOR DE MADERA	\$ 303,643.36	\$ 303,643.36	\$ -

\$	937,302.23	\$	937,302.23	\$	-
\$	149,968.36		100.00%		0.00%
\$	1,087,270.59				

Avance Físico

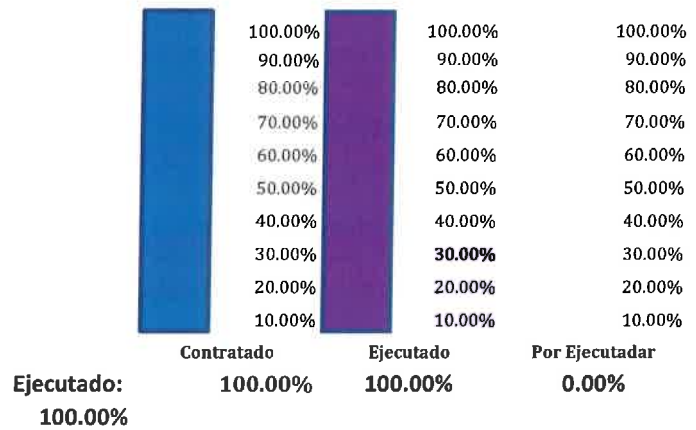

ELABORO:

P.ING.CARLOS ALBERTO AVILA OSORIO.
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS.
