



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD**



Obra: **CONSTRUCCION DE CEMENTERIO VERTICAL**

Localidad: **TULUM**
Municipio: **TULUM, QUINTANA ROO**
Contrato: **HAT/DGOYSFM/COP3P/004/RF/2019**

REPORTE

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
-------	---------	------------	-----------	--------------

CONSTRUCCION DE CEMENTERIO VERTICAL

A	PRELIMINARES	\$ 8,496.62	\$ 8,496.62	0.00
B	CIMENTACION	\$ 98,687.70	\$ 98,687.70	0.00
C	ALBAÑILERIA	\$ 295,251.41	\$ 295,251.41	0.00
D	ESTRUCTURA	\$ 677,942.41	\$ 677,942.41	0.00
E	ALBAÑILERIA AZOTEA	\$ 153,058.58	\$ 153,058.58	0.00
F	ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	\$ 172,549.83	\$ 172,549.83	0.00
G	INSTALACION HIDRAULICA	\$ 120,747.04	\$ 120,747.04	0.00
H	INSTALACION ELECTRICA EDIFICIO	\$ 13,247.76	\$ 13,247.76	0.00
I	TAPAS CENZARIOS	\$ 455,095.00	\$ 455,095.00	0.00
J	POZOS DE ABSORCION	\$ 4,624.54	\$ 4,624.54	0.00
EXTRA	EXTRAORDINARIOS	\$ 152,076.53	\$ 152,076.53	0.00
				0.00


TOTAL CEMENTERIO \$ 2,151,777.42 \$ 2,151,777.42 \$ -

\$	2,151,777.42	\$	2,151,777.42	\$	-
----	--------------	----	--------------	----	---

TOTAL CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO VERTICAL

\$ 344,284.39 **100.00%**
\$ 2,496,061.81

Avance Físico

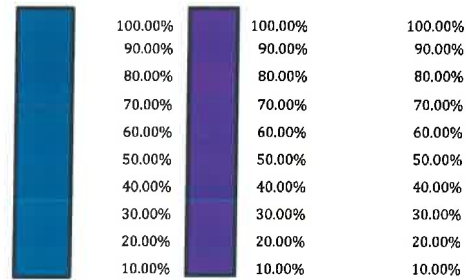

Ejecutado:
100.00%

Contratado
100.00%

Ejecutado
100.00%

Por Ejecutar
0.00%

ELABORO:
T.C.U MANLIO CABRERA ARGAEZ
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS.
