



DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD



Obra: MT-2309007.- CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PREESCOLAR SIMÓN BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE FRANCISCO UH MAY.


Localidad: FRANCISCO UH MAY
Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/026/FISM-DF/2019


REPORTE

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
	PRELIMINARES	\$ 14,091.94	\$ 14,091.94	0.00
	TOTAL CIMENTACION.	\$ 180,113.50	\$ 180,113.50	0.00
	TOTAL ALBAÑILERIA	\$ 128,755.65	\$ 128,755.65	0.00
	TOTAL ESTRUCTURA DE CONCRETO	\$ 128,850.67	\$ 128,850.67	0.00
	TOTAL ALBAÑILERIA DE AZOTEA	\$ 77,622.03	\$ 77,622.03	0.00
	TOTAL ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	\$ 218,429.43	\$ 218,429.43	0.00
	TOTAL INSTALACION HIDRAULICA	\$ 5,651.31	\$ 5,651.31	0.00
	TOTAL INSTALACIÓN SANITARIA	\$ 39,967.62	\$ 39,967.62	0.00
	TOTAL INSTALACIÓN ELECTRICA EDIFICIO	\$ 52,131.73	\$ 52,131.73	0.00
	TOTAL DE INSTALACIÓN DE GAS	\$ 13,823.08	\$ 13,823.08	0.00
	TOTAL CARPINTERÍA, CANCELERÍA Y HERRERÍA	\$ 131,644.26	\$ 131,644.26	0.00
	TOTAL AREA VERDE	\$ 21,112.80	\$ 21,112.80	0.00
	TOTAL RAMPA Y PASILLOS	\$ 19,012.39	\$ 19,012.39	0
		\$ 1,031,206.41	\$ 1,031,206.41	\$ -
		\$ 164,993.03	100.00%	0.00%
		\$ 1,196,199.44		

Avance Físico

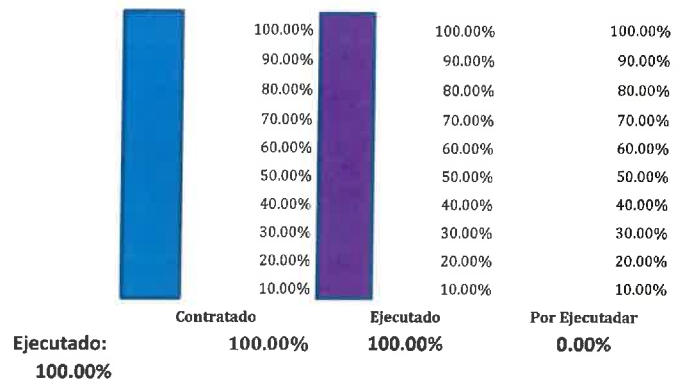

Avance Financiero

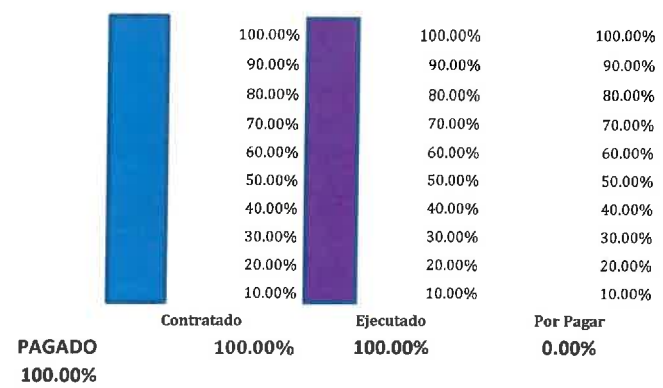

ELABORÓ

C. ROGER VALERIO PAT POOT
 RESIDENTE DE OBRA
