



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
MUNICIPALES  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA  
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD**



Obra: **CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS REGION 4**

Localidad: **TULUM**

Municipio: **TULUM, QUINTANA ROO**

Contrato: **HAT/DOYSPM/COPLP/038/RP/2019**

**REPORTE**

ESTIMACION

PERIODO ESTIM.

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	EJECUTADO TOTAL	POR EJECUTAR
-------	---------	------------	-----------	-----------------	--------------

**CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS REGION 4**

A	PRELIMINARES	\$ 439,843.53	\$ 439,843.53	\$ 439,843.53	0.00
B	GUARNICIONES Y BANQUETAS	\$ 2,140,376.11	\$ 2,140,376.11	\$ 2,140,376.11	0.00

\$ 2,580,219.64 \$ 2,580,219.64 \$ 2,580,219.64 \$

**TOTAL GUARNICIONES Y BANQUETAS**

\$ 2,580,219.64 \$ 2,580,219.64 \$ 2,580,219.64 \$


\$ 2,580,219.64	\$ 2,580,219.64	\$ 2,580,219.64	\$ -
-----------------	-----------------	-----------------	------

**TOTAL CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS**


\$ 412,835.14 100.00% 100.00% 0.00%

\$ 2,993,054.78

**Avance Físico**

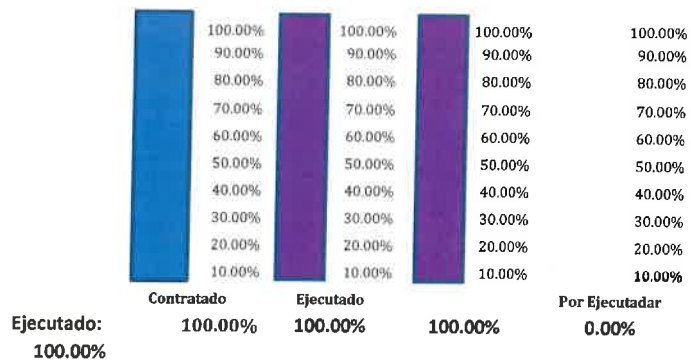

**Avance Financiero**

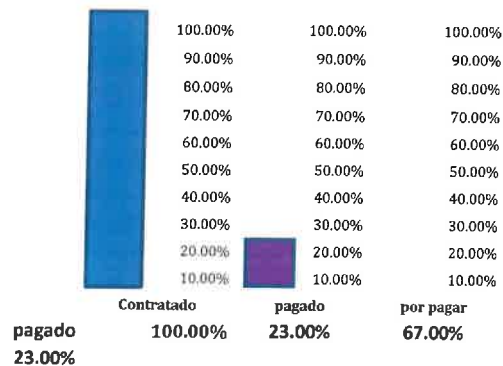

ELABORO  
T.C.U MANDIO CABRERA ARGAEZ  
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS.
