



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD**



Obra: "MT-2309012.-AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO
COLONIA XUL-KAA (SEGUNDA ETAPA)"

Localidad: TULUM


Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGOYSPM/COPAD/047/RP-FISM-DF/2019

REPORTE UNICO


CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
A	PRELIMINARES	\$ 2,657.39	2657.39	
B	EXCAVACIÓN	\$ 90,359.40	90359.40	
C	PLANTILLAS	\$ 789.83	789.83	
D	RELLENOS	\$ 126,101.74	126101.74	
E	SUMINISTRO DE TUBERIAS	\$ 42,074.10	42074.10	
F	INSTALACIÓN DE TUBERIAS	\$ 34,273.40	34273.40	
G	SUMINISTRO DE POZOS DE VISITA	\$ 44,714.24	44714.24	
H	INSTALACION DE POZOS DE VISITA	\$ 47,666.98	47666.98	
J	SUMINISTRO DE MANGAS DE EMPOTRAMIENTO	\$ 4,357.29	4357.29	
K	INSTALACIÓN DE MANGAS DE EMPOTRAMIENTO	\$ 8,799.66	8799.66	
		\$ 401,794.03	\$ 401,794.03	\$ -
		\$ 64,287.04	100.00%	0.00%
		\$ 466,081.07		

Avance Físico

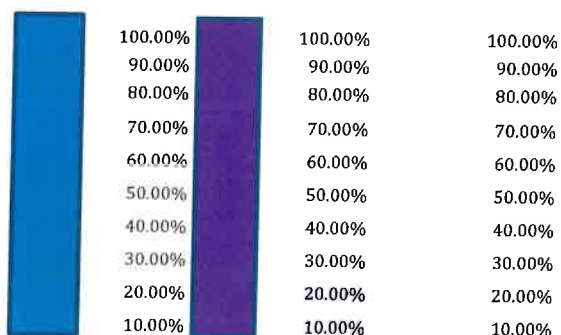

**Ejecutado:
100.00%**

Avance Financiero

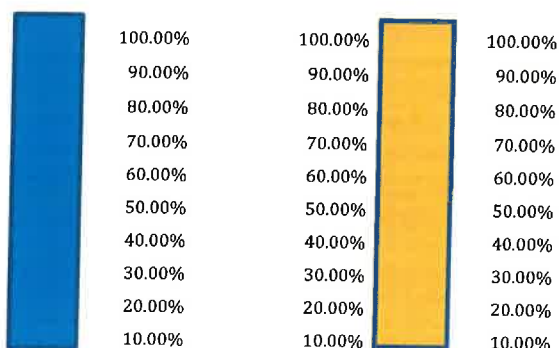

**PAGADO
0.00%**

ELABORO:

P.ING.CARLOS ALBERTO AVILA OSORIO.
RESIDENTE DE OBRA
