



DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD
 AT-DGP-2309002 AMPLIACION Y REHABILITACION DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE TULUM





Localidad: TULUM
 Municipio: TULUM, QUINTANA ROO
 Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/008/FORTAMUNDF/2022

REPORTE

16-jul-23

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	EJECUTADO TOTAL	POR EJECUTAR
MT-DGP-2309002 AMPLIACION Y REHABILITACION DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE TULUM					
A	PRELIMINARES	\$1,652.63	\$1,652.63	\$1,652.63	\$ -
B	ALBAÑILERIA	\$82,462.52	\$82,462.52	\$82,462.52	\$ -
C	ESTRUCTURA DE CONCRETO	\$242,012.43	\$242,012.43	\$242,012.43	\$ -
D	ALBAÑILERIA AZOTEA	\$116,595.73	\$116,595.73	\$116,595.73	\$ -
E	ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	\$245,262.34	\$245,262.34	\$245,262.34	\$ -
F	INSTALACION SANITARIA	\$12,064.07	\$12,064.07	\$12,064.07	\$ -
H	INSTALACION ELECTRICA	\$177,221.54	\$177,221.54	\$177,221.54	\$ -
I	CARPINTERIA CANCELERIA Y HERRERIA	\$62,226.80	\$62,226.80	\$62,226.80	\$ -
J	TABLA ROCA	\$74,111.73	\$74,111.73	\$74,111.73	\$ -
K	INSTALACION HIDRAULICA	\$19,434.08	\$19,434.08	\$19,434.08	\$ -
L	INSTALACION SANITARIA EXTRAORDINARIOS	\$40,646.78	\$40,646.78	\$40,646.78	\$ -
		\$ 424,599.27	\$ 424,599.27	\$ 424,599.27	\$ -
		\$1,498,289.90	\$1,498,289.90	\$ 1,073,690.65	\$ -
		\$ 1,498,289.90	\$ 1,498,289.90	\$ 1,073,690.65	\$ -
		\$ 1,498,289.90	\$ 1,498,289.90	\$ 1,073,690.65	\$ -
		\$ 239,726.38	100.00%	71.66%	
		\$ 1,738,016.28			

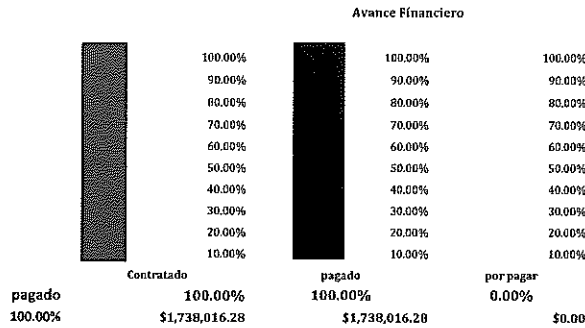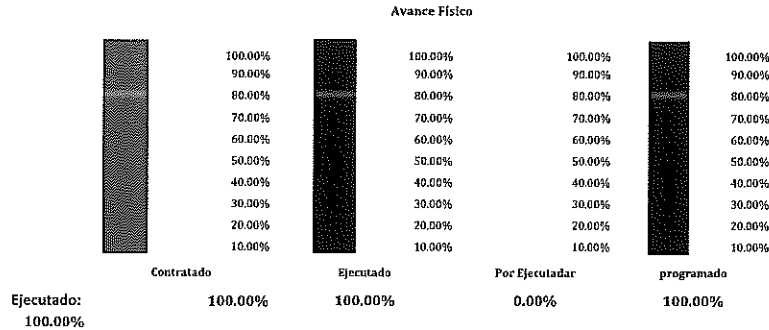

ELABORÓ
 MANLIO CABREBA ARGAEZ
