

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA



TULUM

Obra: " MT.- DGP-2309003.- SEÑALETICA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE TULUM "

Localidad: TULUM

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/009/FORTAMUNDF/2022

REPORTE

31/07/2023

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	EJECUTADO TOTAL	POR EJECUTAR
-------	---------	------------	-----------	-----------------	--------------

MT- DGP-2309003 SEÑALETICA EN DISTITOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE TULUM


A	SEÑALETICA HORIZONTAL	\$624,511.43	\$624,511.43	\$624,511.43	\$0.00
B	SEÑALETICA VERTICAL	\$99,547.57	\$99,547.57	\$99,547.57	\$0.00
C	SEMAFORIZACION EXTRAORDINARIOS	\$295,105.45	\$295,105.45	\$295,105.45	\$0.00
		\$478,792.72	\$478,792.72	\$478,792.72	

\$ 1,497,957.17 \$ 1,497,957.17 \$ 1,497,957.17 \$ -


TOTAL DE SEMAFORIZACION \$ 1,497,957.17 \$ 1,497,957.17 \$ 1,497,957.17 \$ -

\$	1,497,957.17	\$	1,497,957.17	\$	1,497,957.17	\$	-
\$	239,673.15	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%		
\$	1,737,630.32						

Avance Físico

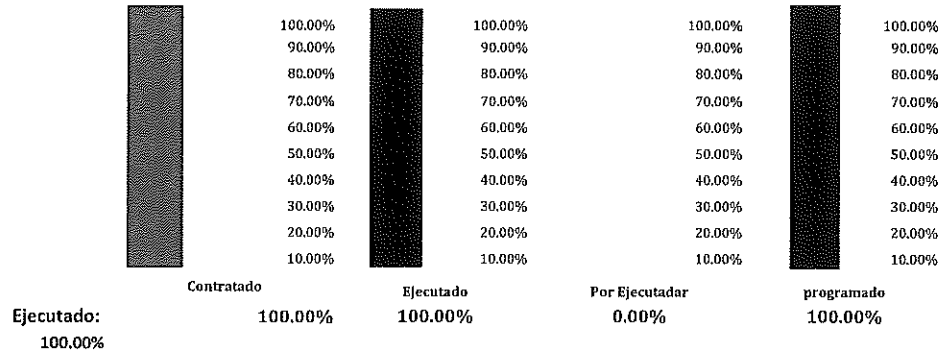

Avance Financiero

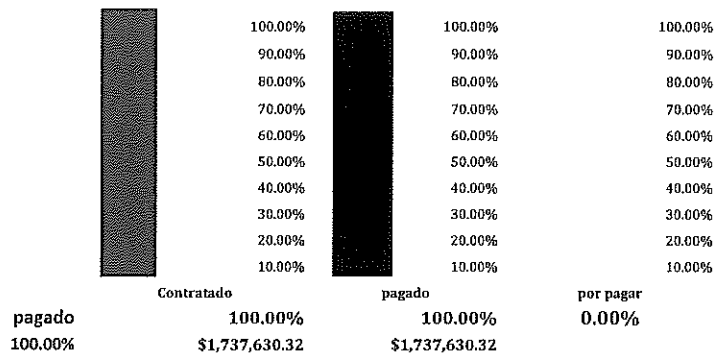

ELABORO
MANLIO CABRERA ARGAEZ
RESIDENTE DE OBRA
