



**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBRA**



EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL
Obra: MANEJO Y DISPOSICION DE SARGAZO EN LA ZONA DE
TRANSFERENCIA (PLAYA PESCADORES).

Localidad: TULUM


Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

PERIODO DE EJECUCION : 01 DE JULIO DE 2022 AL 29 DE AGOSTO DE 2022


Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/020/ZOFEMAT-REM/2022

TULUM QUINTANA ROO A 29 DE AGOSTO DE 2022

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
A	OBRA CIVIL	\$ 245,341.53	\$ 148,773.61	
B	INSTALACION ELECTRICA	\$ 398,879.24	\$ 94,331.85	
	EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ 401,115.31	
		\$ 644,220.77	\$ 644,220.77	
		\$ 103,075.32	\$ 103,075.32	
		\$ 747,296.09	\$ 747,296.09	

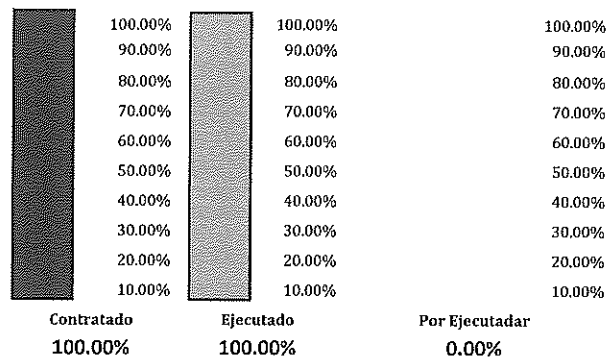

Avance Financiero

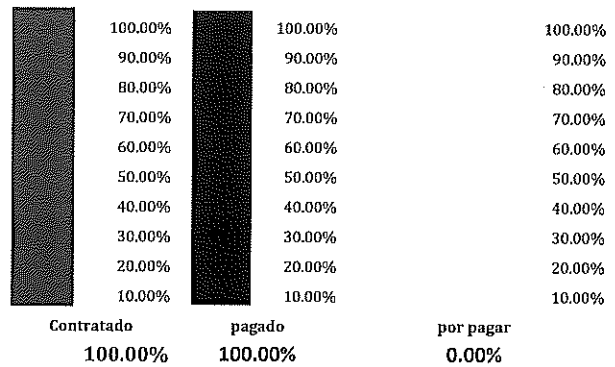

ELABORÓ:

ARQ. ALEJANDRO RAMIREZ CORDERO
RESIDENTE DE OBRA
