

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD



TULUM

Obra: CONSTRUCCION DE CELDAS CANINAS DE CONCENTRACION CANINA PARA OPERATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y REHABILITACION DEL CUARTO DE ARMERIA

Localidad: TULUM

REPORTE

11/08/2023

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGOYSPM/COP3P/025/REM- R28/2022

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	EJECUTADO TOTAL	POR EJECUTAR
-------	---------	------------	-----------	-----------------	--------------

CONSTRUCCION DE CELDAS CANINAS DE CONCENTRACION CANINA PARA OPERATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y REHABILITACION DEL CUARTO DE ARMERIA


A-1	PRELIMINARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A-2	CIMENTACION	\$74,638.87	\$74,638.87	\$74,638.87	\$0.00
A-3	ALBAÑILERIA	\$596,771.25	\$596,771.25	\$596,771.25	\$0.00
A-4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	\$16,957.68	\$16,957.68	\$16,957.68	\$0.00
A-5	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$20,952.13	\$20,952.13	\$20,952.13	\$0.00
B-1	PRELIMINARES	\$1,125.95	\$1,125.95	\$1,125.95	\$0.00
B-2	ESTRUCTURA	\$44,090.11	\$44,090.11	\$44,090.11	\$0.00
B-3	ACABADOS	\$8,963.21	\$8,963.21	\$8,963.21	\$0.00
B-4	CARPINTERIA Y HERRERIA EXTRAORDINARIO	\$1,715.85	\$1,715.85	\$1,715.85	\$0.00
		\$2,378.68	\$2,378.68	\$2,378.68	\$0.00

\$767,593.72 \$767,593.72 \$ 767,593.73 \$ -


TOTAL DE SEMAFORIZACION \$ 767,593.72 \$ 767,593.72 \$ 767,593.73 \$ -

\$	767,593.72	\$	767,593.72	\$	767,593.73	\$	-
\$	122,815.00	100.00%	100.00%				
\$	890,408.72						

Avance Físico

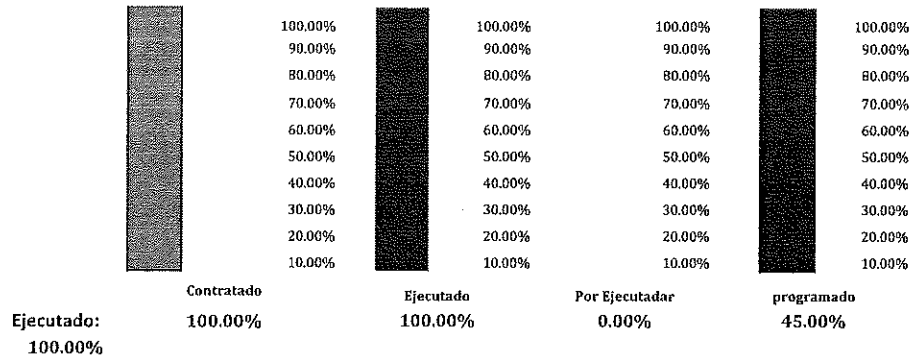

Avance Financiero

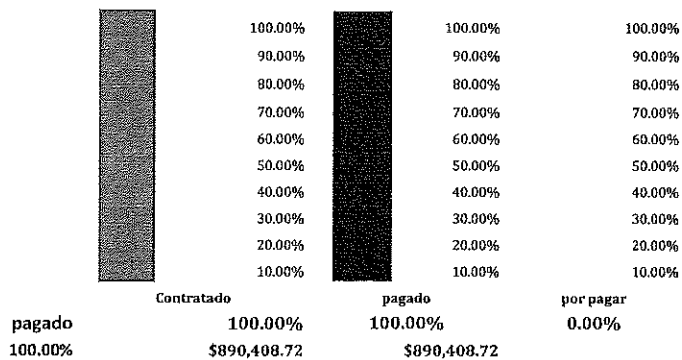

ELABORO
MANLIO CARRERA ARGAEZ
RESIDENTE DE OBRA
