



**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBRA**



Obra: CONSTRUCCION DE CALLES A NIVEL TERRACERIAS EN LA COLONIA LA VELETA

TULUM QUINATANA ROO A 25 DE JUNIO DE 2024

Localidad: TULUM

PERIODO DE EJECUCION : 20 DE MAYO AL 03 DE JULIO DE 2024


Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGIP/DCyC/COPLP/R28/013/2024

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
-------	---------	------------	-----------	--------------

A	PRELIMINARES	\$ 985,989.05	\$ 109,765.02	
B	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS	\$ 1,595,835.36		
SUBTOTAL		\$ 2,581,824.41	\$109,765.02	
16% I.V.A		\$413,091.91	\$17,562.40	
TOTAL		\$ 2,994,916.32	\$ 127,327.42	
		100%	4%	

Avance Físico

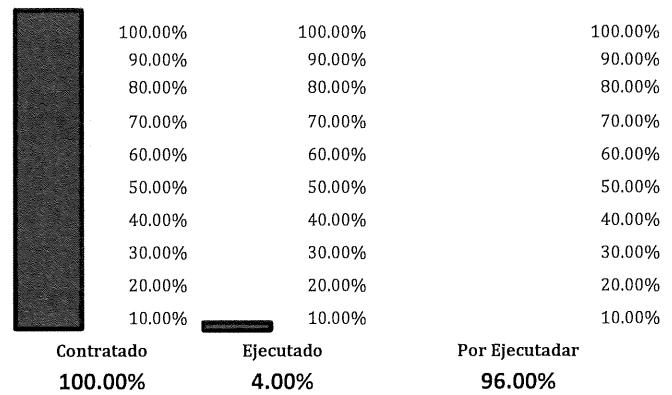

ELABORÓ:

ARQ. ALEJANDRO RAMIREZ CORDERO
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBRA



Obra: CONSTRUCCION DE CALLES A NIVEL TERRACERIAS EN LA COLONIA LA VELETA

TULUM QUINATANA ROO A 25 DE JUNIO DE 2024


Localidad: TULUM

PERIODO DE EJECUCION : 20 DE MAYO AL 03 DE JULIO DE 2024

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGIP/DCyC/COPLP/R28/013/2024

Avance Financiero

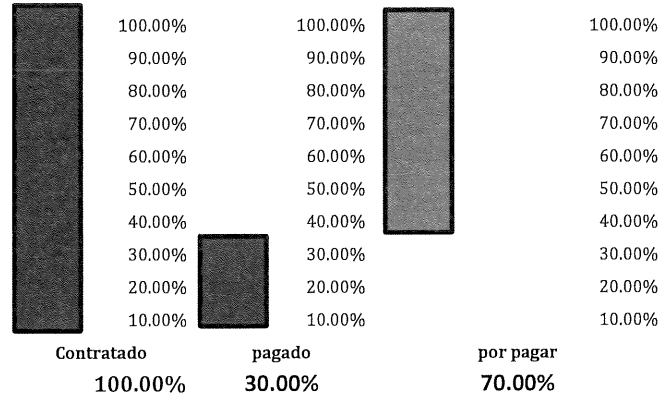

ELABORÓ:

ARQ. ALEJANDRO RAMIREZ CORDERO
RESIDENTE DE OBRA
