



DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA



Obra: "MT- DGPM-2309004.- CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TULUM"

Localidad: TULUM

REPORTE

24 JUNIO DEL 2024


Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

CONTRATO: HAT/DGIP/DCyC/COP3P/FAISMUN/008/2024				
--	--	--	--	--


CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	EJECUTADO TOTAL	POR EJECUTAR
	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN	\$ 2,152,573.04	\$ 813,609.36	\$ 813,609.36	\$ 1,338,963.68
		\$ 2,152,573.04	\$ 813,609.36	\$ 813,609.36	\$ 1,338,963.68

\$2,152,573.04	\$813,609.36	\$813,609.36	\$1,338,963.68
\$2,152,573.04	\$813,609.36	\$813,609.36	\$1,338,963.68
\$ 2,152,573.04	\$ 813,609.36	\$813,609.36	\$ 1,338,963.68
\$ 2,152,573.04	\$ 813,609.36	\$ 813,609.36	\$ 1,338,963.68
\$ 344,411.69	\$ 130,177.50	\$ 130,177.50	\$ 214,234.19
\$ 2,496,984.73	\$ 943,786.86	\$ 943,786.86	\$ 1,553,197.87
	37.00%	37.00%	63.00%

Avance Físico

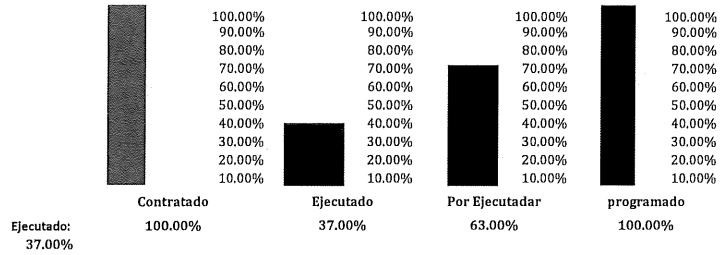

Avance Financiero

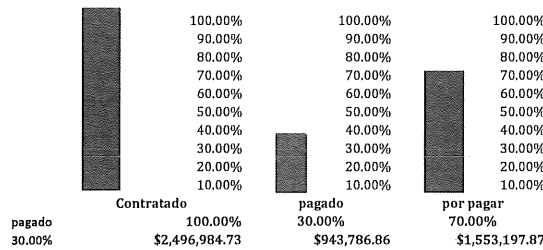

ELABORÓ  
  
 MANLIO CABRERA ARGUEZ
