



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD**



Obra: PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE AKUMAL

Localidad: TULUM

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/001/RP/2019

REPORTE


CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
-------	---------	------------	-----------	--------------

I PAVIMENTACION SEGUNDA ETAPA

1.00	TERRACERIA	\$ 1,233,789.62	\$ 1,233,789.62	0.00
2.00	PAVIMENTACION	\$ 1,778,266.11	\$ 1,778,266.11	0.00

\$ 3,012,055.74	\$ 3,012,055.73	\$ -
\$ 481,928.92	100.00%	0.00%
\$ 3,493,984.65		

Avance Físico

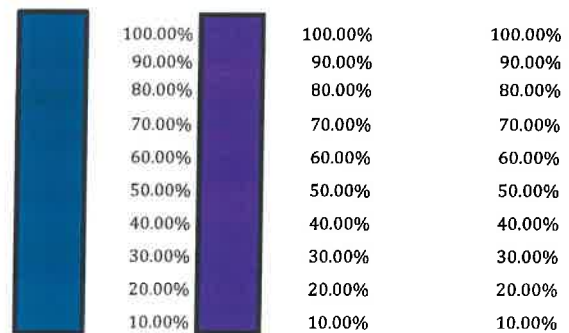

Ejecutado:	100.00%	100.00%	0.00%
	100.00%		

ELABORO:

P. ING. CARLOS ALBERTO AVILA OSORIO.
RESIDENTE DE OBRA
