

## DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DIRECCION DE OBRA PUBLICA COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD




Obra: DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE TULUM

Localidad: TULUM Municipio: TULUM

Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/043/RP/2018

LAVE	PARTIDA	CONTRATADO					
		CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE AVANCE	PODCENTALER	
	DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION				7 - 111100	PORCENTAJE DE AVANCE FALTANTE	PORCENTAJE DE AVANCE TO
1.1	DESASOLVE DE POZOS DE ABSORCION CON MAQUINARIA DE					<del> </del>	
	1 DATE OF THE TOTAL OF THE PROPERTY OF THE PRO						
	INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, TRASLADO DE LOS PUNTOS DE REFERENCIA DE LA MISMA MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y RETIRO DE MATERIA DE SANTA D		i			9	
	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESASOLVE.		!		i		
		\$ 734,556.00	\$ 509,292.16	\$ 225,263.84			
	LIMPIEZA DE CAPTADOR-ARENERO			223,263.84	53.75	23.78	_
	UNAVIANDE I						
2.1	LIMPIEZA GENERAL GRUESA Y FINA EN LAS CELDAS QUE			<del> </del>			
	TOTAL CAMMINEL CUERPD DEL CADTADODA ADMINISTRA						
				1			
	ARENERO, CARGA Y COLOCACION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL EXTERIOR DE LAS CELDAS, CARGA Y ACARREO FUERA DEL SITTO DEL ACESTA DE LA CARGA Y ACARREO			,			
				1			
	EXCAVACION Y DE LA LIMPIEZA.						
		\$ 212,911.50	\$ 144,779.82	\$ 68,131.68	15,28		
					13.28	7.19	
		\$ 947,467.50	\$ 654,071.98	\$ 293,395.52	\$ 60.00		
					69.03	\$ 30,97	\$ 10

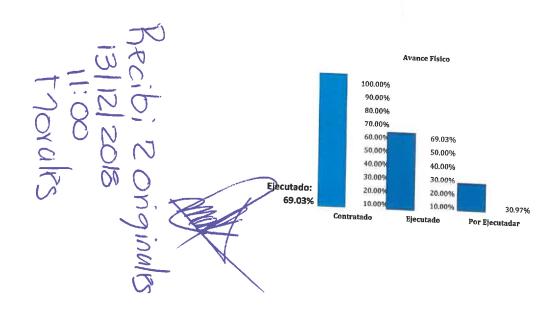



## DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DIRECCION DE OBRA PUBLICA

COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD

Obra: DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE TULUM

Localidad: TULUM

Municipio: TULUM

Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/043/RP/2018



800,000

	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR			30.0
			SJECTIADO	POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE FALTANTE	BOD CENTS IN S. T.
	DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION						PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL
	Note that the second se						
1.1	DESASOLVE DE POZOS DE ABSORCION CON MAQUINARIA DE						
	PERFORACION DE 10 MTS. HASTA 25 MTS. DE DECOMPANDA DE						
	PACLUTE: MANU DE OBRA, MACHINADIA TRACIADO DE LOS DELIGIOS			1	1		
	DE REFERENCIA DE LA MISMA MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESASOLVE.						1
	TO THE CONTROL OF THE DESASOLVE.	\$ 774 FF4 00					1
		\$ 734,556.00	\$ 509,292.16	\$ 225,263.84	77.53		
	LIMPIEZA DE CAPTADOR-ARENERO					<u></u> -	
2.1	LIMPIEZA GENERAL GRUESA Y FINA EN LAS CELDAS QUE CONFORMAN						
	ILL COURTO DEL CAPIAININA-APENEDO DOD MEDIOCALAMIA						
	1EQUITO MENUK, INCLUYE: EXCAVACION CON DICO V DAY 4 DOS V						
	DADORA COMPACIADA DENTRO DE CAPTADOD, ADENEDO CARCA III						
	COLUCACION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCATACIONA						
	EXTERIOR DE LAS CELDAS, CARGA Y ACARREO FUERA DEL SITIO DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y DE LA		i				
	LIMPIEZA.						}
		\$ 212,911.50	\$ 144,779.82				
			4 144,779.82	\$ 68,131.68	22.47		l
							<u>-</u>
					-		
		\$ 947,467.50	654,071.98	\$ 293,395,52	100.00		
					100.00	<u> </u>	\$ 1

Por Ejecutadar

REPORTE DE AVANCE FÍSICO ESTIMACION 02 (DOS FINIQUITO)

Avance Físico 100.00% 90.00% 90.00% 80.00% 80.00% 70.00% 70.00% 60.00% 60.00% 50.00% 50.00% 40.00% 40.00% 30,00% 30.00% Ejecutado: 20.00% 20.00% 100.00% 10.00% 10.00% Contratado
