



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD**



00654

**PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA CENTRO SEGUNDA ETAPA
Obra: (CIRCUITO: CALLE OMEGA SUR, CALLE MERCURIO PONIENTE Y CALLE
JUPITER SUR)**

Localidad: TULUM

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/045/RP/2018

PRIMER REPORTE


CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
-------	---------	------------	-----------	--------------

I PAVIMENTACION SEGUNDA ETAPA

1.00	TERRACERIA	\$ 551,672.06	\$ 551,672.06	0.00
2.00	PAVIMENTACION	\$ 1,824,881.28	\$ 1,356,834.00	468,047.28

\$ 2,376,553.34	\$ 1,908,506.06	\$ 468,047.28
\$ 380,248.53	80.31%	19.69%
\$ 2,756,801.87		

Avance Físico

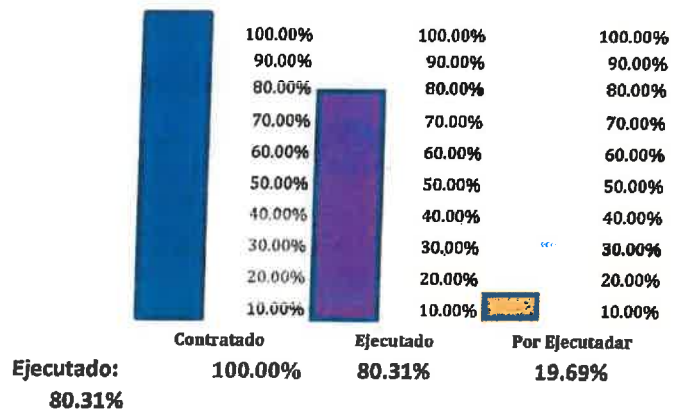

ELABORO:

P.ING. CARLOS ALBERTO AVILA OSORIO.
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS.



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD**



000701

PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA CENTRO SEGUNDA ETAPA
Obra: (CIRCUITO: CALLE OMEGA SUR, CALLE MERCURIO PONIENTE Y CALLE JUPITER SUR)

Localidad: TULUM

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/045/RP/2018

SEGUNDO REPORTE


CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
-------	---------	------------	-----------	--------------

I PAVIMENTACION SEGUNDA ETAPA

1.00	TERRACERIA	\$ 551,672.06	\$ 551,672.06	0.00
2.00	PAVIMENTACION	\$ 1,824,881.28	\$ 1,824,881.28	0.00

\$ 2,376,553.34	\$ 2,376,553.33	\$ -
\$ 380,248.53	100.00%	0.00%
\$ 2,756,801.87		

Avance Físico

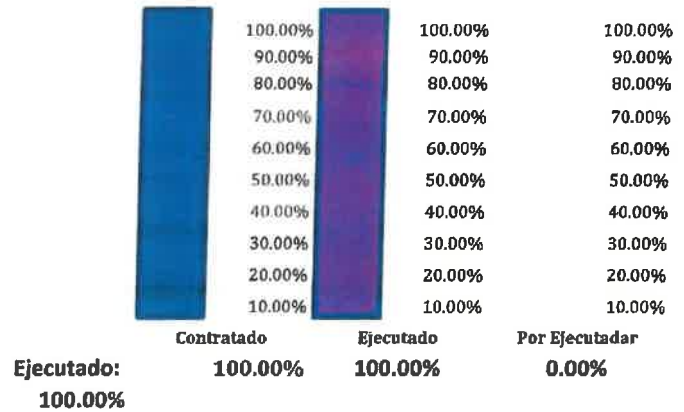

ELABORO:

ING. FRANCISCO LIMA ESPADAS.
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS.
