



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD**



Obra: **MT-2309002.-SEÑALIZACION VIAL Y SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE TULUM**
 Localidad: **TULUM**
 Municipio: **TULUM, QUINTANA ROO**
 Contrato: **HAT/DGOYSPM/COPLP/002/FORTAMUN-DF/2019**


CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
-------	---------	------------	-----------	--------------

SEÑALIZACION


A	SEÑALETICA	\$ 2,128,517.55	\$ 2,128,517.55	0.00
---	------------	-----------------	-----------------	------

\$ 2,128,517.56	\$ 2,128,517.55	\$ -
\$ 340,562.81	100.00%	0.00%
\$ 2,469,080.36		

Avance Físico

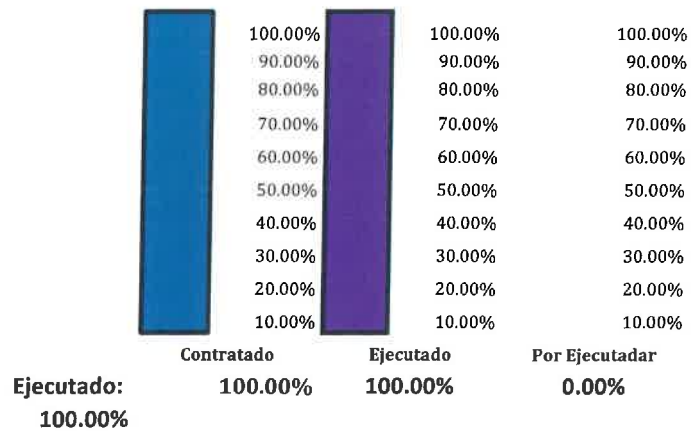

Avance financiero

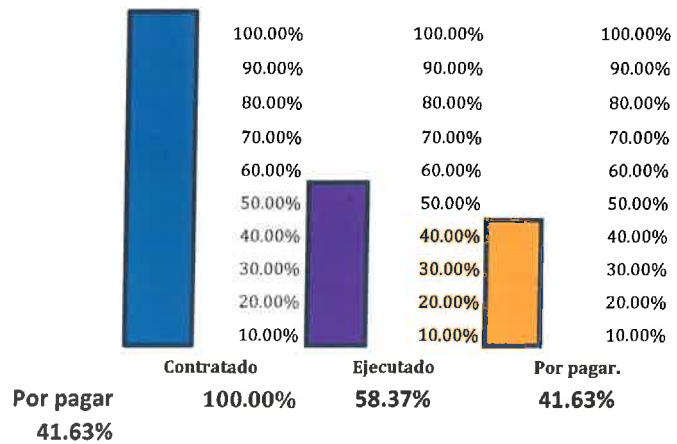

ELABORO:

ARQ. ZENALDA JAIMES DURAN
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS.
