



DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD



REPAVIMENTACION DE CALLES EN LA REGION 1 PRIMERA ETAPA

Localidad: TULUM, QUINTANA ROO

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/011/RP/2019

REPORTE

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
-------	---------	------------	-----------	--------------

REPAVIMENTACION DE CALLES EN LA REGION 1 PRIMERA ETAPA


A	TERRACERIAS	\$ 776,505.20	\$ 776,505.20	0.00
B	PAVIMENTOS	\$ 2,665,543.68	\$ 2,665,543.68	0.00
				0.00

TOTAL COMEDOR \$ 3,442,048.88 \$ 3,442,048.88 \$ -


\$ 3,442,048.88	\$ 3,442,048.88	\$ -
\$ 550,727.82	100.00%	0.00%
\$ 3,992,776.70		

TOTAL CONSTRUCCION DE DOMO

Avance Físico

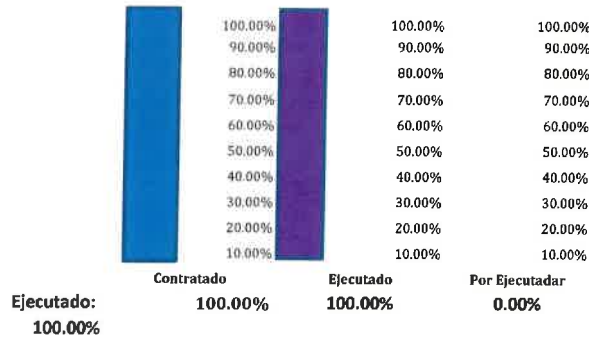

Avance Financiero

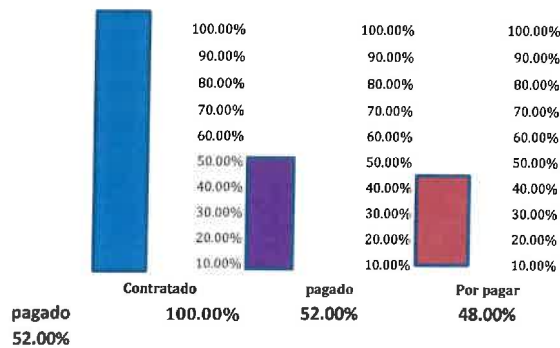

P.ING. GAËL FRANCISCO PÉREZ ARCEO
RESIDENTE DE OBRA.
