



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
MUNICIPALES  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA  
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD**



Obra: CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA  
TELESECUNDARIA "ERICK PAOLO MARTINEZ"

Localidad: TULUM

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGOYSPM/COP3P/014/RP/2019


**REPORTE**

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
-------	---------	------------	-----------	--------------


A	PRELIMINAR	\$ 47,050.95\$*	\$ 47,050.95\$*	0.00
B	CIMENTACION	\$ 145,323.62\$*	\$ 145,323.62\$*	0.00
C	ESTRUCTURA DE CONCRETO Y ALBAÑILERIA	\$ 201,512.73\$*	\$201,512.73\$*	0.00
D	ESTRUCTURA DE ACERO Y CUBIERTO	\$ 1,193,112.98\$*	\$ 1,193,112.98\$*	0.00
E	INSTALACION ELECTRICAS Y BAJANTES PLUVIALES	\$ 62,094.21\$*	\$ 62,094.21\$*	0.00
F	EQUIPAMIENTO	\$ 188,443.32\$*	\$ 188,443.32\$*	0.00
G	ACABADOS	\$ 305,383.70\$*	\$ 305,383.70\$*	0.00
H	DESASOLVES DE POZOS	\$ 7,093.42\$*	\$ 7,093.42\$*	0.00
I	RAMPAS	\$ 880.11\$*	\$ 880.11\$*	0.00

\$	2,150,895.04\$*	\$	2,150,895.04\$*	\$	- \$*
\$	344,143.21\$*	100.00%		0.00%	
\$	2,495,038.25\$*				

**Avance Físico**

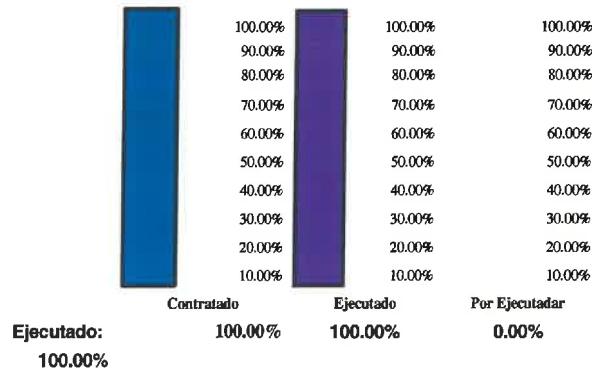

**Avance Financiero**

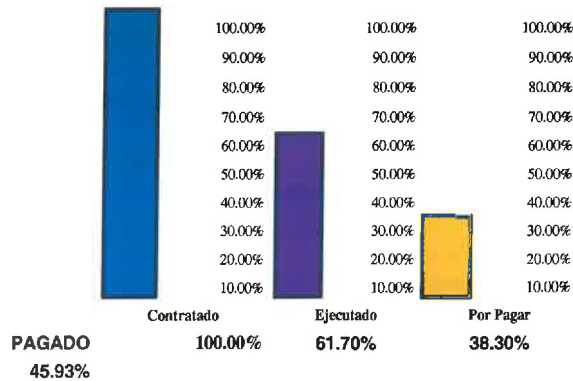

*Roger*
