



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD**



Obra: PAVIMENTACION DE CALLES EN LA REGION 9 DE LA LOCALIDAD DE TULUM

Localidad: TULUM

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/019/RP/2019


REPORTE FINAL

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
-------	---------	------------	-----------	--------------


1.00	TERRACERIA	\$ 1,104,618.43	\$ 1,104,618.43	0.00
2.00	PAVIMENTACION	\$ 1,906,397.96	\$ 1,906,397.96	0.00

\$ 3,011,016.39	\$ 3,011,016.39	-\$ 0.00
\$ 481,762.62	100.00%	0.00%
\$ 3,492,779.01		

Avance Físico

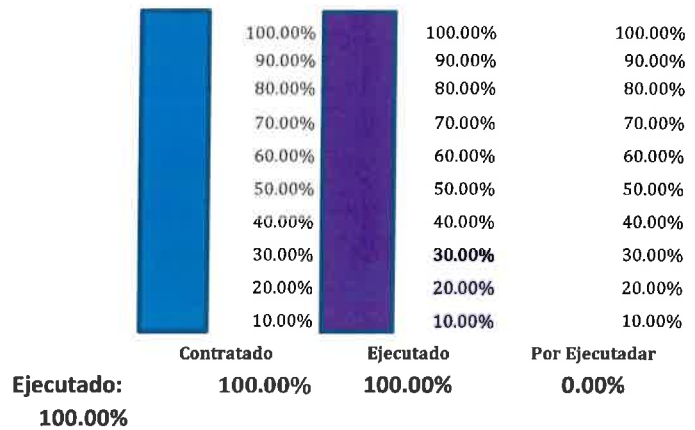

Avance Financiero

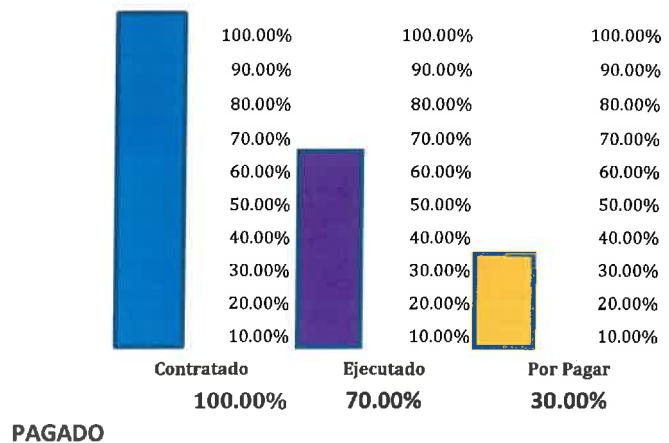

ELABORO:

P.ING.CARLOS ALBERTO AVILA OSORIO.
RESIDENTE DE OBRA
